

Projekt Schachtanlage Asse II

2. Zwischenbericht zur Fortschreibung der Projektablaufplanung zum Stand 31.03.2013

Auftraggeber: Bundesamt für Strahlenschutz

Willy-Brandt-Straße 5 38226 Salzgitter

Auftragnehmer: ARCADIS Deutschland GmbH

Theodor-Heuss-Allee 108 60486 Frankfurt am Main

Projektnummer: DE0111.100373



Dokumentenerstellung / Prüfvermerk

	Name	Datum	Position
Erstellt durch:	Lutz Rommel/Karsten Brinkmann	26.03.2013	Senior Projektleiter
Geprüft durch:	Dr. Volker Tonn	02.05.2013	Senior Projektleiter
Freigegeben durch:	Hans-Jürgen Schnell	02.05.2013	Senior Projektleiter

Änderungsverzeichnis

Datum	Version	Name	Änderungsgrund	Status
26.03.2013	1.1	Rommel/Brinkmann	Erstellung	
08.04.2013	1.2	Brinkmann	Redaktionelle Überarbeitung	
23.04.2013	1.3	Brinkmann	Redaktionelle Überarbeitung	
02.05.2013	1.4	Brinkmann	Redaktionelle Überarbeitung	



Zusammenfassung

ARCADIS Deutschland GmbH (ADE) wurde vom Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) im März 2012 mit der Erstellung eines Rahmenterminplans für die Rückholung der radioaktiven Abfälle aus der Schachtanlage Asse II auf der Grundlage des vom BfS bereits veröffentlichten Netzplans und der im BfS vorhandenen Termindaten beauftragt.

Mit Stand vom 21.05.2012 hatte ADE einen Zwischenbericht zur Fortschreibung der Projektablaufplanung für die Rückholung einschließlich eines Rahmentermin- und Meilensteinplans erstellt. In diesem Terminplan wurde der früheste Termin für den Beginn der Rückholung im Jahr 2036 ausgewiesen.

Unter Berücksichtigung der sicherheitstechnischen Randbedingungen der Schachtanlage Asse II wurde dieser Termin vom BfS für nicht akzeptabel erklärt und eine Beschleunigung des Beginns der Rückholung für zwingend erforderlich gehalten.

Um dieser Aufgabe nachzukommen wurde zunächst im BfS ein "internes Brainstorming" durchgeführt. Anschließend wurden die hierbei identifizierten Beschleunigungspotenziale und weitere Potenziale mit der Asse-GmbH und der DMT GmbH & Co. KG (DMT) im Rahmen einer Arbeitstagung diskutiert.

In einem weiteren Schritt wurden die mit hoher Priorität versehenen Beschleunigungspotenziale mit ca. 110 Projektbeteiligten sowie Stakeholdern am 24. und 25.09.2012 in einem Fachworkshop in Wolfenbüttel diskutiert, an dem u.a. Experten des BMU, des NMU, von Beratungsgremien des BMU sowie Vertreter der Asse-2-Begleitgruppe (A2B) und der Arbeitsgruppe Optionen - Rückholung (AGO) teilgenommen haben.

Die Ergebnisse des Fachworkshops wurden vom BfS analysiert und mit dem Bericht vom 09.11.2012 veröffentlicht.

Am 25.09.2012 wurde ADE vom BfS mit der Erstellung einer weiteren Fortschreibung der Projektablaufplanung einschließlich Rahmentermin- und Meilensteinplan beauftragt.

In einem ersten Schritt hat ADE eine systematische Erfassung aller beim BfS und den weiteren Projektbeteiligte vorhanden Termindaten durchgeführt und auf Abweichungen gegenüber dem 1. Zwischenbericht überprüft.

Hierzu wurden Abweichungen gegenüber dem Stand Mai 2012, insbesondere aufgrund der Wendelsperrung, beim Bohrprogramm der Faktenerhebung Schritt 1 und Fertigstellung des Bohrplatzes für Schacht 5, im Hinblick auf Auswirkungen auf den Beginn der Rückholung untersucht.

In einem weiteren Schritt wurden Abläufe mit dem Ziel optimiert, die Auswirkungen von festgestellten Verzögerungen auf den Beginn der Rückholung zu minimieren.

Durch die Aktualisierung der Terminplanung wurde die Voraussetzung für die weitergehende Untersuchung zur Machbarkeit der Umsetzung von identifizierten Beschleunigungspotenzialen geschaffen.

Hierzu wurde vom BfS eine Arbeitsgruppe gebildet, die im Zeitraum von Januar bis März 2013 in einer Serie von Arbeitsgruppensitzungen mit Experten des BfS, DMT und ADE die Beschleunigungspotenziale analysiert und im Hinblick auf die technische, organisatorische Machbarkeit sowie die Genehmigungsfähigkeit untersucht hat.



2. Zwischenbericht zur Fortschreibung der Projektablaufplanung zum Stand 31.03.2013

Durch das am 28. Februar 2013 vom Bundestag verabschiedete Gesetz zur Beschleunigung der radioaktiven Abfälle aus der Schachtanlage Asse II ("Lex Asse") wurden wesentliche Voraussetzungen für die Umsetzung von Beschleunigungsmaßnahmen geschaffen.

Auf dieser Grundlage wurden von der Arbeitsgruppe alle bekannten Beschleunigungspotenziale in den Arbeitsgruppensitzungen diskutiert und einschließlich Beschreibung der jeweiligen Annahmen, Bewertung der Risiken und Auswirkung auf Termine, Kosten und Qualitäten in einem standardisierten Verfahren dokumentiert.

Von ADE wurden die sich daraus ergebenden Änderungen von Anordnungsbeziehungen und Zeitdauern auf dem kritischen Pfad zum Beginn der Rückholung untersucht und das Ergebnis in der Fortschreibung des Rahmenterminplans dokumentiert.

Unter Berücksichtigung veränderter Rahmenbedingungen, eingetretener Verzögerungen und der Umsetzung empfohlener Beschleunigungsmaßnahmen weist die Aktualisierung des Rahmenterminplans einen frühesten Termin für den Beginn der Rückholung im Jahr 2033 aus.

Inwieweit diese Beschleunigungspotenziale tatsächlich greifen, kann erst im Laufe des Fortschritts der Teilprojekte der Rückholung beurteilt werden.



2. Zwischenbericht zur Fortschreibung der Projektablaufplanung zum Stand 31.03.2013

Inhaltsverzeichnis

ZΙ	USAMMEN	FASSUNG	
1	EINLEIT	UNG	1
2	71E1 CET	zung	1
3	VORGE	HENSWEISE	2
4	ABBILD	UNG DER PROJEKTSTRUKTUR IN DER TERMINPLANUNG	2
5	STAND	DER PROJEKTABLAUFPLANUNG	4
	5.1 ALI	GEMEIN	4
	5.2 BES	CHREIBUNG DES KRITISCHEN PFADES ZUM BEGINN DER RÜCKHOLUNG	
	5.3 BE	SINN DER RÜCKHOLUNG	5
6	DOKUM	IENTATION VON ÄNDERUNGEN	5
	6.1 GE	ÄNDERTE TERMINE UND ANORDNUNGSBEZIEHUNGEN	
		FAILLIERTE DARSTELLUNG VON ÄNDERUNGEN	
	6.2.1	Notfallvorsorge und Stabilisierung	
	6.2.2	Faktenerhebung	<i>6</i>
	6.2.3	Schacht 5	6
7	BESCHL	EUNIGUNGSMAßNAHMEN	6
	7.1 UN	ISETZUNG DER BESCHLEUNIGUNGSPOTENZIALE	6
	7.2 BE	CHREIBUNG DER BESCHLEUNIGUNGSPOTENZIALE	7
	7.2.1	Allgemein	7
	7.2.2	Sofortiger Beginn der Planung zur Rückholung	8
	7.2.3	Entkopplung Bau Zwischenlager von Faktenerhebung	8
	7.2.4	Beginn des Schrittes 2 der Faktenerhebung vor Abschluss der Notfallvorsorgemaßnahmen	9
	7.2.5	Auffahrung der neuen Infrastrukturräume UT vom Schacht Asse 2 aus	10
	7.2.6	Lösen der Abhängigkeit zwischen Konditionierungstechnik und Rückholung	11
	7.2.7	Lösen der Abhängigkeit zwischen Bergetechnik und Faktenerhebung	12
8	RISIKEN		13
۵	A NINI A LI	MEN	12



2. Zwischenbericht zur Fortschreibung der Projektablaufplanung zum Stand 31.03.2013

Abkürzungsverzeichnis

15

Anlagenverzeichnis

Anlage 1	Rahmenterminplan (RTP) Projekt Schachtanlage Asse II – Stand 27.03.2013
Anlage 2	Meilensteinliste
Anlage 3.1	Risikoliste – Stand 31.03.2013
Anlage 3.2	Risikoliste – Stand 09.05.2012
Anlage 4.1	Annahmenliste – Stand 31.03.2013
Anlage 4.2	Annahmenliste – Stand 09.05.2013
Anlage 5	Ergebnisse der Arbeitsgruppe Beschleunigung

2. Zwischenbericht Rev 1.4



1 Einleitung

Gemäß §57b AtG hat das BfS den Auftrag, die Schachtanlage Asse II unverzüglich stillzulegen.

ARCADIS Deutschland GmbH (ADE) wurde vom Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) im März 2012 mit der Erstellung eines Rahmenterminplans (RTP) für die Rückholung der radioaktiven Abfälle aus der Schachtanlage Asse II auf der Grundlage des vom BfS bereits veröffentlichten Netzplans und der im BfS vorhandenen Termindaten beauftragt. Aus dem RTP ergab sich aufgrund der für die Vorbereitung der Rückholung erforderlichen Planungs-, Genehmigungs- und Ausführungszeiträume ein frühester möglicher Zeitpunkt für den Beginn der Rückholung im Jahr 2036.

Daraufhin wurde dieser Termin vom BfS für nicht akzeptabel erklärt und Maßnahmen zur Untersuchung von Beschleunigungsmaßnahmen eingeleitet.

Nach einem "internen Brainstorming" des BfS wurden die identifizierten Beschleunigungspotenziale im Rahmen einer Arbeitstagung mit der Asse-GmbH und der DMT diskutiert.

Anlässlich eines vom BfS ausgerichteten Fachworkshops in Wolfenbüttel am 24. und 25.09.2012 wurden die mit hoher Priorität versehenen Beschleunigungspotenziale mit 110 Projektbeteiligten und Stakeholdern diskutiert.

Am 25.09.2012 wurde ADE beauftragt den vorhandenen Projektablauf einschließlich Rahmentermin- und Meilensteinplan fortzuschreiben. Die Fortschreibung sollte als Grundlage für die Einarbeitung von Beschleunigungsmaßnahmen dienen, deren Umsetzung vom BfS im weiteren Verfahren weiterverfolgt wurde.

Durch das am 28. Februar 2013 vom Bundestag verabschiedete "Gesetz zur Beschleunigung der Rückholung radioaktiven Abfälle und der Stilllegung der Schachtanlage Asse II" wurden die Rahmenbedingungen für Durchführung von Beschleunigungsmaßnahmen geschaffen.

2 Zielsetzung

Ziel dieses Berichtes ist es, die im Rahmen der Fortschreibung der Projektablaufplanung festgestellten Änderungen gegenüber dem Planungsstand Mai 2012 und die Auswirkung von zur Umsetzung empfohlenen Beschleunigungsmaßnahmen auf den Beginn der Rückholung zu dokumentieren.

Stand: 31.03.2013 1/17



3 Vorgehensweise

Zur Fortschreibung des Rahmenterminplans Stand Mai 2012 wurden von ADE alle Veränderungen auf der Basis der beim BfS eingeführten Geschäftsprozesse zur Terminplanung und zum Termincontrolling systematisch erfasst.

Auf Basis von Erfassungsbögen wurden Änderungen sowie Abweichungen des Istzustandes von den Sollterminen erfasst.

In einem ersten Schritt wurden sämtliche erfassten Abweichungen im Hinblick auf die Auswirkung auf den kritischen Pfad für den Beginn der Rückholung untersucht.

In einem zweiten Schritt wurden Möglichkeiten zur Kompensierung von eingetretenen Verzögerungen (z.B. Wendelsperrung, Bohrprogramm Faktenerhebung Schritt 1) untersucht.

Die Ergebnisse dienten als Grundlage für die Entscheidung der Umsetzung von Kompensationsmaßnahmen durch die Projektleitung des BfS.

In einem weiteren Schritt wurde durch eine Arbeitsgruppe des BfS unter Beteiligung von DMT und ADE die Machbarkeit der identifizierten Beschleunigungsmaßnahmen überprüft.

Auf der Basis der Untersuchung von "Was-wäre-wenn-Szenarien" wurden dann die Auswirkungen unterschiedlicher Szenarien untersucht und die zur Umsetzung empfohlenen Beschleunigungsmaßnahmen in die Projektablaufplanung eingearbeitet.

4 Abbildung der Projektstruktur in der Terminplanung

Das Gesamtprojekt Schachtanlage Asse II gliedert sich in der Terminplanung wie folgt:

Vorbereitung der Rückholung

- Faktenerhebung Schritt 1
- Faktenerhebung Schritt 2
- Faktenerhebung Schritt 3
- Schacht 5
- Infrastruktur unter Tage
- Bergungstechnologie
- Transportverfahren
- Entsorgung der Abfälle (Konditionierungstechnologie)
- Infrastruktur über Tage

Stand: 31.03.2013 2/17



Zwischenlager

- Festlegung des Standortes
- Erschließung
- Öffentliche Netze
- Verkehrsanbindung
- Bauwerke
- Außenanlagen

Rückholung

- Rückholung 750 m Sohle
- Verfüllung Einlagerungskammern der 750 m Sohle
- Rückholung 725 m Sohle
- Verfüllung Einlagerungskammern der 725 m Sohle
- Rückholung 511 m Sohle
- Verfüllung Einlagerungskammern der 511 m Sohle

Notfallvorsorge und Stabilisierung

- Planung Offenhaltung
- Technische Vorbereitung Notfall
- Vorbereitung Anlagen und Umbauten
- Verfüllung und Abdichtung

Stilllegungsmaßnahmen

- Verwahrung der Schachtanlage
- Restrückbau unter Tage
- Rückbau der Anlagen über Tage
- Rekultivierung

Bestandsertüchtigung

- Ertüchtigung Schacht 2
- Baumaßnahmen zur Offenhaltung

Sonderaufgaben

- Messverfahren
- Erkundungen
- Analysen

Stand: 31.03.2013 3/17

5 Stand der Projektablaufplanung

5.1 **Allgemein**

Der Rahmenterminplan (RTP) basiert auf der aktuellen Ablaufplanung der vorgenannten Struktur. Die für die Fortschrittskontrolle verbindlichen Meilensteine sind in einer zusätzlichen Meilensteinliste dargestellt (siehe Anlage 2).

Für die vorliegende Fortschreibung des RTP wurden neben den Rückmeldungen der Maßnahmenverantwortlichen innerhalb des BfS auch die vorhandenen Detailterminpläne der Asse-GmbH und weiterer Projektbeteiligten einbezogen.

Die Kenntnisse über den Zustand des eingelagerten Materials und der ELK reichen bisher nicht aus, um zum heutigen Stand die geeignete Bergetechnik mit Kapazitätsbetrachtung für die endgültige Ausführung zu bestimmen.

Da für die Rückholung selbst bisher keine weiteren Zustandserkenntnisse über das eingelagerte Material vorliegen, ist der Zeitansatz für die Ausführung der Rückholung nicht genau kalkulierbar.

5.2 Beschreibung des kritischen Pfades zum Beginn der Rückholung

Die nachfolgende Beschreibung des Projektablaufs bis zum Beginn der Rückholung bezieht sich auf Vorgänge, welche auf dem zurzeit gültigen kritischen Pfad liegen.

Die Faktenerhebung Schritt 1 verläuft auf Basis eines optimierten Ablaufs und nach Genehmigungsbescheid. Mit den Bohrungen wurde am 01.06.2012 begonnen. Die Aufgaben werden voraussichtlich, wie geplant, bis Ende 2018 abgeschlossen.

Die vorliegende Fortschreibung geht davon aus, dass die Realisierung des Schachtes 5 von der zum Abschluss der Faktenerhebung Schritt 3 vorgesehenen Auswertung und Überprüfung der Machbarkeit der Rückholung losgelöst ist und für den Schritt 3 der Faktenerhebung (probeweises Bergen) nicht benötigt wird.

Die Entwicklung der Konditionierungstechnik und der Bergetechnik wurde vom terminführenden Pfad entkoppelt indem Planungsprozesse nur schrittweise mit Ergebnissen aus den Auswertungen der Faktenerhebung Schritt 1, 2 und 3 versorgt werden, die je nach Erkenntnisstand für die weitere Planung bereitgestellt und in die laufenden Planungs- und Realisierungsprozesse eingesteuert werden.

Die Bauausführung des Zwischenlagers liegt nicht auf dem kritischen Pfad für den Beginn der Rückholung. Ein untertägiges Pufferlager ist zur Bauausführung des Schrittes 2 der Faktenerhebung verfügbar.

4/17 Stand: 31.03.2013



Das Aufsetzen der Entwurfsplanung zur Rückholung auf den Ergebnissen der Faktenerhebung Schritt 2 bildet nunmehr den kritischen Pfad.

5.3 Beginn der Rückholung

Unter Berücksichtigung veränderter Rahmenbedingungen, eingetretener Verzögerungen und der Umsetzung empfohlener Beschleunigungsmaßnahmen weist die Aktualisierung des Rahmenterminplans einen frühesten Termin für den Beginn der Rückholung im Jahr 2033 aus.

6 Dokumentation von Änderungen

6.1 Geänderte Termine und Anordnungsbeziehungen

Die Anfangs-/Endtermine sowie Dauern aus den Rückmeldelisten wurden zur Aktualisierung der Terminplanung erfasst. Die Ist-Termine und Dauern wurden den Soll-Terminen und Dauern aus Mai 2012 gegenübergestellt und von ADE ausgewertet. Zusätzlich wurden Planungsänderungen identifiziert, die sich aus der Präzisierung interner Planungen des BfS und aus Planungen von Zuarbeiten von gebundenen Projektbeteiligten bei den Teilprojekten Notfallvorsorge und Stabilisierung, Faktenerhebung, Schacht 5, Zwischenlager und Bergetechnik ergeben hatten.

Diese Änderungen bewirkten nicht nur eine Fortschreibung der Termine und Dauern, sondern erforderten teilweise die Überprüfung und Überarbeitung von Anordnungsbeziehungen, um einen schlüssigen Projektablauf aufrecht zu erhalten.

Zur Optimierung der Abläufe und zur Kompensierung von eingetretenen Verzögerungen mussten verschiedene, im Basisplan Stand Mai 2012 festgelegte Anordnungsbeziehungen angepasst werden.

Zur Nachvollziehbarkeit und Kontrolle von Änderungen der Terminplanung wurde im BfS ein Entscheidungsvorlageverfahren angewendet. Dadurch wurde sichergestellt, dass nur Änderungen umgesetzt wurden, die vorher von der Projektleitung autorisiert wurden.

Die Änderungen betrafen insbesondere die Abläufe folgender Teilprojekte:

- Notfallvorsorge und Stabilisierung und
- Faktenerhebung Schritt 1

Weitere Planungsänderungen ergaben sich aus den übergebenen Detailplanungen der Asse-GmbH. Diese wurden von ADE nach Bestätigung durch die Projektleitung in die Fortschreibung der Terminplanung des BfS übernommen.

Stand: 31.03.2013 5/17



6.2 Detaillierte Darstellung von Änderungen

6.2.1 Notfallvorsorge und Stabilisierung

Folgende Ereignisse führten zu Verzögerungen im Ablauf der Notfallvorsorge und Stabilisierung:

- Rissbildung im Bereich der Wendelstrecke führte zur Unterbrechung der Wendelstrecke und Trennung des befahrbaren Grubengebäudes,
- Verspätete Fertigstellung von Verfüllungsmaßnahmen allgemein und
- eine nicht im RTP enthaltene Notfallvorbereitung zur Verfüllung von Kammern im LAW-Bereich

6.2.2 Faktenerhebung

Bei der Faktenerhebung musste das Bohrprogramm angepasst werden. Verzögerungen haben sich insbesondere durch die fehlende Möglichkeit eine Parallelisierung des Anbohrens von Kammer 12 und Kammer 7 wegen des Lösungssumpfes vor Kammer 12 und abzustellende Genehmigungsauflagen (Bsp. Kr-85 Monitoring und Stickstoff-Inertisierung) ergeben.

6.2.3 Schacht 5

Bei der Erkundung des Schachtes 5 sind Verzögerungen eingetreten, wie z.B. bei der Fertigstellung des Bohrplatzes, die Einfluss auf die nachfolgenden Aktivitäten haben und zusammen mit geänderten Dauern den geplanten Fertigstellungstermin verzögern.

7 Beschleunigungsmaßnahmen

7.1 Umsetzung der Beschleunigungspotenziale

Vom Bundesamt für Strahlenschutz wurde im Januar 2013 die Arbeitsgruppe Beschleunigung ins Leben gerufen, um die Ergebnisse des Fachworkshops Asse zu bewerten. Diese Bewertung hat zum Ziel, eine Empfehlung über eine Umsetzung der einzelnen Beschleunigungspotenziale auszusprechen und die Risiken bzw. Chancen der Umsetzung aufzuzeigen.

Vom 24.01.2013 an bewerteten Mitarbeiter des Bundesamtes für Strahlenschutz, der DMT und der ADE als Teilnehmer der Arbeitsgruppe die im Fachworkshop Asse herausgearbeiteten Beschleunigungspotenziale.

Die Beschleunigungspotenziale als Ergebnis des Fachworkshops Asse wurden in einem ersten Schritt hinsichtlich ihrer Auswirkungen geordnet. In den weiteren Planungssitzungen wurden die Potenziale hinsichtlich ihrer technischen und organisatorischen Machbarkeit sowie ihrer Genehmigungsfähigkeit untersucht. Risiken und

Stand: 31.03.2013 6/17



Chancen wurden diesen Bewertungen zugeordnet und die Auswirkungen hinsichtlich der Termine und Kosten beschrieben.

Folgende Annahmen aus der Lex Asse wurden von der Projektleitung vorgegeben, und allen Beschleunigungspotenzialen zugrunde gelegt:


- Die Dauer der unter die Lex Asse fallenden Genehmigungsverfahren ist pauschal mit 6 Monaten anzusetzen
- Genehmigungsphase (GPH) und Bauausführung (BAF) überlappen um 2 Monate (BAF beginnt 2 Monate vor Ende GPH),
- Das Junktim zwischen FE und NVM wird aufgehoben (Aussagen zum Umgang mit Störfallplanungswerten in Lex Asse)
- Der MS 0030 "Entscheidung Rückholung" ist obsolet. Kein Warten anderer Teilprojekte bzw. Teilaufgaben mehr.

Die Empfehlungen der Arbeitsgruppe Beschleunigung wurden in Form von Kurzanalysen zu den Beschleunigungspotenzialen an die Projektleitung übergeben.

7.2 Beschreibung der Beschleunigungspotenziale

7.2.1 **Allgemein**

Die in der Terminplanung mit Stand 31.03.2013 umgesetzten Beschleunigungspotenziale wurden im Rahmen der Arbeitsgruppe Beschleunigung im Januar bis März 2013 analysiert und in Form von Kurzanalysen (siehe Anlage 5) bewertet. Eine Beschleunigung der aktuellen Terminplanung gegenüber der Planung mit Stand Mai 2012 ergibt sich durch eine Neuanordnung von Vorgängen im Netzplan. Generell wurden die Teilprojekte bzw. -aufgaben soweit wie möglich parallel angeordnet. Diese Anordnung bewirkt gegenüber einer sequenziellen Anordnung (siehe Terminplan Stand Mai 2012) einen früheren Termin für den Beginn der Rückholung. Diese Neuanordnung von Teilprojekte bzw. -aufgaben beinhaltet Risiken und Chancen, die für jedes Beschleunigungspotenzial in den Kurzanalysen der Arbeitsgruppe Beschleunigung ausgewiesen sind (siehe Anlage 5).

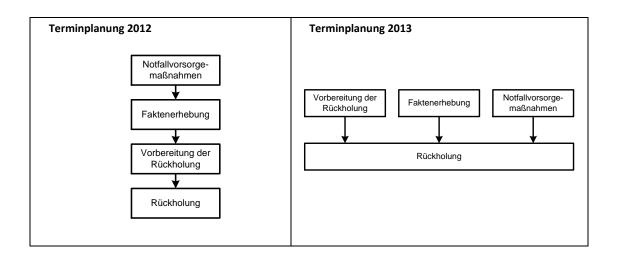


7/17 Stand: 31.03.2013



Nachfolgend sind die wesentlichen Beschleunigungspotenziale und ihre Effekte aufgezeigt.

7.2.2 Sofortiger Beginn der Planung zur Rückholung

In der Terminplanung Stand Mai 2012 baut die Planung der Rückholung auf den endgültigen Ergebnissen der Faktenerhebung und der Entwicklung der Bergetechnik auf. Das heißt, erst wenn die Faktenerhebung abgeschlossen ist, beginnt die Planung zur Rückholung. Diese Abhängigkeit der Planung gegenüber der Faktenerhebung wurde aufgehoben, so dass die Planung sofort beginnen kann. Da bei dieser Anordnung Grundlagen für die Planungen fehlen, muss diese abdeckend erfolgen. Dafür werden Grundlagen verschiedener Szenarien angenommen, was zu mehr Aufwand bei der Planung führt, diese dafür aber eher fertiggestellt sein kann. Als Annahme wird zugrunde gelegt, dass die Entwicklung der Bergetechnik für die Rückholung im Rahmen der Planung für die Rückholung erfolgt.



7.2.3 Entkopplung Bau Zwischenlager von Faktenerhebung

Der Bau und die Inbetriebnahme des Zwischenlagers war in der Terminplanung Stand Mai 2012 gekoppelt an die Fertigstellung der Faktenerhebung. Dabei wurde die Annahme zugrunde gelegt, dass die Planung der Konditionierungstechnik auf den Ergebnissen der Faktenerhebung aufbaut und dass der Bau erst nach Fertigstellung der Konditionierungstechnik abgeschlossen werden kann (siehe Lösen der Abhängigkeit von Konditionierungstechnik und Rückholung). Diese Anordnung der Vorgänge berücksichtigte auch die Annahme, dass die Investitionen zur Errichtung des Zwischenlagers erst mit abschließenden Erkenntnissen über die Machbarkeit der Rückholung erfolgen können.


Diese Abhängigkeit wurde in der aktuellen Terminplanung gelöst, so dass die Erstellung des Zwischenlagers nach Fertigstellung der Planungen beginnen kann. Um einen Leerstand des Gebäudes zu vermeiden, wurde der Zeitraum zur Errichtung des Zwischenlagers so spät gewählt, dass eine Verzögerung der Rückholung ausge-

2. Zwischenbericht Rev 1.4

Stand: 31.03.2013 8/17



schlossen ist, gleichzeitig aber ein längerfristiger Leerstand vermieden wird. Im Falle eines Abbruchs der Rückholung wäre die Investition der Bauausführung zwar verloren, jedoch stellt man mit dem frühzeitigen Beginn der Bauausführung die rechtzeitige Aufnahmebereitschaft für die Rückholung sicher.

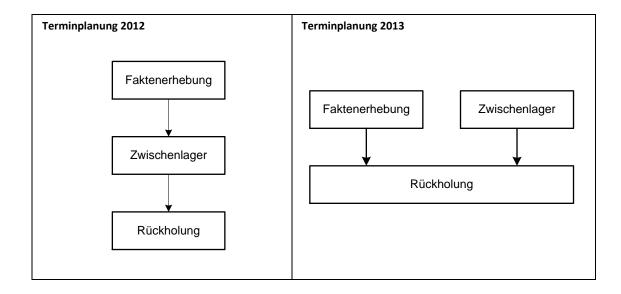

7.2.4 Beginn des Schrittes 2 der Faktenerhebung vor Abschluss der Notfallvorsorgemaßnahmen


Die bisherige Terminplanung mit Stand Mai 2012 ging davon aus, dass der Schritt 2 der Faktenerhebung, Öffnen der Einlagerungskammern 7/750 und 12/750, erst nach Fertigstellung der Sicherungs- und Notfallvorsorgemaßnahmen beginnen kann. Das heißt, dass das angestrebte Topfkonzept abgeschlossen sein sollte, bevor eine Kammer geöffnet wird.

Diese Abhängigkeit wurde in der aktuellen Planung gelöst, so dass die Faktenerhebung, soweit technisch und organisatorisch möglich, parallel zur Fertigstellung der Notfallvorsorgemaßnahmen durchgeführt werden kann.

Da die Kapazitäten unter Tage aufgrund der bestehenden Wetter- und Fluchtwegsituation begrenzt sind, kann es bei der parallelen Durchführung untertägiger Arbeiten zu zeitlichen und räumlichen Konflikten kommen. Das heißt, dass es bei den Notfallvorsorgemaßnahmen oder bei der Faktenerhebung zu Verzögerungen kommen kann. Ein frühzeitiger Erkenntnisgewinn aus Schritt 2 der Faktenerhebung ermöglicht wiederum eine frühzeitige Rückholung.

Stand: 31.03.2013 9/17



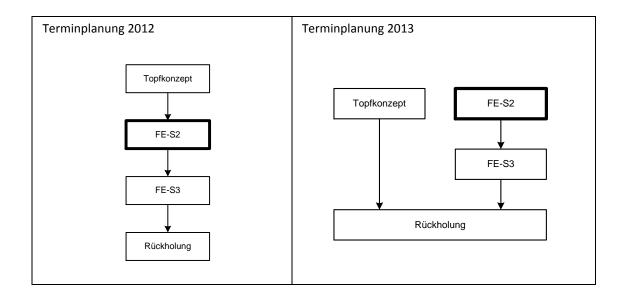

7.2.5 Auffahrung der neuen Infrastrukturräume UT vom Schacht Asse 2 aus


Die bisherige Terminplanung mit Stand Mai 2012 ging davon aus, dass zuerst der Schacht Asse 5 fertiggestellt wird, bevor die untertägigen Infrastrukturräume nahe dem Schacht Asse 5 aufgefahren werden. Diese Infrastrukturräume sind Voraussetzung für die Durchführung der Rückholung.

Die aktuelle Planung geht von der Annahme aus, dass diese Infrastrukturräume zunächst vom bestehenden Schacht Asse 2 aus aufgefahren werden. Diese sind somit Teil des bestehenden Grubengebäudes und weitgehend fertiggestellt, bevor der Schacht Asse 5 abgeteuft ist. Der Anschluss an das bestehende Grubengebäude erfolgt nach Fertigstellung Schacht Asse 5.

Das Abteufen von Schacht Asse 5 und die Auffahrung der neuen untertägigen Infrastrukturräume erfolgen parallel. Ein zeitlicher sowie räumlicher Konflikt mit parallel laufenden untertägigen Arbeiten ist möglich. Eine frühzeitige Fertigstellung der untertägigen Infrastrukturräume und Inbetriebnahme des Schachts Asse 5 ermöglicht eine frühzeitige Rückholung.

Stand: 31.03.2013 10/17




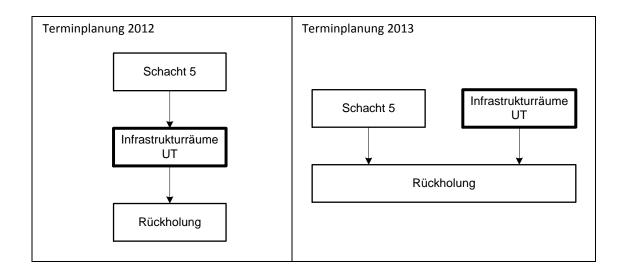

7.2.6 Lösen der Abhängigkeit zwischen Konditionierungstechnik und Rückholung

Die bisherige Terminplanung mit Stand Mai 2012 ging davon aus, dass eine Fertigstellung der Konditionierungstechnik Voraussetzung für den Beginn der Rückholung ist. In Verbindung mit der Annahme, dass die Planung der Konditionierungstechnik auf den Ergebnissen der Faktenerhebung aufbaut und dass der Bau des Zwischenlagers erst nach Fertigstellung der Konditionierungstechnik abgeschlossen werden kann, war die Fertigstellung und Inbetriebnahme des Zwischenlagers einschließlich der Konditionierungstechnik terminbestimmend für den Beginn der Rückholung.

Der aktuellen Terminplanung liegt die Annahme zugrunde, dass das geplante Zwischenlager das gesamte Volumen des zu bergenden Materials aufnehmen kann, und die Konditionierung mit einem zeitlichen Nachlauf durchgeführt wird. Das heißt, dass die Rückholung zeitlich unabhängig von der Entwicklung der Konditionierungstechnik ist.

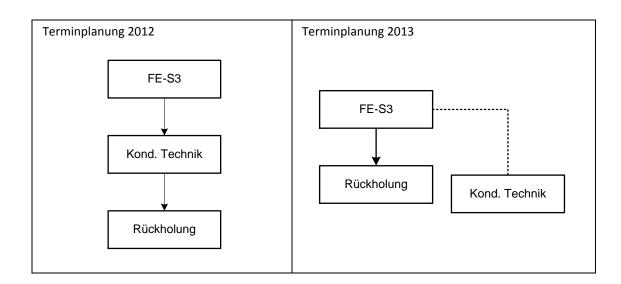

Stand: 31.03.2013 11/17


7.2.7 Lösen der Abhängigkeit zwischen Bergetechnik und Faktenerhebung

Die Entwicklung der Bergetechnik war in der Terminplanung mit Stand Mai 2012 zeitlich abhängig von den Vorgängen der Faktenerhebung.

Die aktuelle Planung geht von einer mehrzügigen Entwicklung der Bergetechnik aus. Diese unterteilt sich in eine Bergetechnik für die Faktenerhebung und eine Bergetechnik für die Rückholung. Beide werden zeitlich unabhängig voneinander geplant, wobei der Austausch von Information zwischen den Teilaufgaben gewährleistet wird. Die Bergetechnik für die Rückholung unterteilt sich zudem in eine Bergetechnik für LAW-Gebinde und MAW-Gebinde, da die Rahmenbedingungen bei der Bergung von mittelradioaktiven und schwachradioaktiven Abfällen unterschiedlich sind.

Die Bergetechnik Rückholung ist Teil der Planung für die Rückholung. Die Bergetechnik Faktenerhebung ist in den Vorgängen zur Planung der Faktenerhebung berücksichtigt.

Bei sofortiger Planung und Ausführung kann es zu einem Investitionsverlust kommen, falls die Rückholung abgebrochen wird. Die Trennung von der Entwicklung der Bergetechnik Rückholung und Faktenerhebung ermöglicht eine frühzeitige Fertigstellung der Faktenerhebung sowie der Bergetechnik Rückholung.

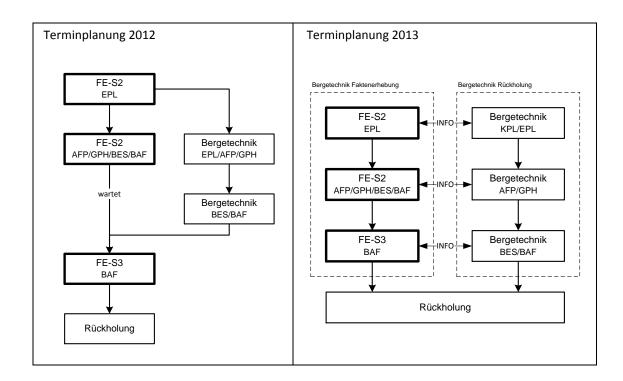

2. Zwischenbericht Rev 1.4

Stand: 31.03.2013 12/17



8 Risiken

Der Ablauf des Projekts unterliegt in allen Teilprojekten weiterhin Risiken, welche in der Risikoliste (siehe Anlagen 3.1 und 3.2) aufgelistet wurden.

Die in Anlage 3.1 aufgeführten Risiken ergaben sich aus der Bewertung der Beschleunigungspotenziale und sind zusätzlich zu den mit Stand Mai 2012 (Anlage 3.2) aufgeführten Risiken zu beachten und bezüglich Präventions- und Kompensationsmaßnahmen weiterzuentwickeln.

9 **Annahmen**

In den Anlagen 4.1 und 4.2 wurden die im Projekt entschiedenen Annahmen für den vorliegenden Projektablauf erfasst.

Im Betrachtungszeitraum wurden weitere wesentliche Annahmen aus der Fortschreibung der Projektablaufplanung erfasst und ergänzend in Anlage 4.1 dargestellt.

13/17 Stand: 31.03.2013



2. Zwischenbericht zur Fortschreibung der Projektablaufplanung zum Stand 31.03.2013

Schachtanlage Asse II

2. Zwischenbericht zur Fortschreibung der Projektablaufplanung zum Stand 31.03.2013 für das Projekt "Schachtanlage Asse II"

Salzgitter-Lebenstedt, 31.03.2013

ARCADIS Deutschland GmbH Theodor-Heuss-Allee 108 60486 Frankfurt am Main Tel +49 (0) 69 7 95 90-0

© ARCADIS Deutschland GmbH

Stand: 31.03.2013 14/17



Abkürzungsverzeichnis

Kürzel	Bezeichnung/Abkürzung	Beschreibung
A2B	Asse-2-Begleitgruppe	
AFL	Anlage zur Förderung von Lösungen	
AFP	Ausführungsplanung	Planungsphase
ALZ	Auflockerungszone	
AOB	Anordnungsbeziehung	Projektablaufplanung
ADE	ARCADIS Deutschland GmbH	
ASSE- GmbH	Gesellschaft für Betriebsführung und Schließung der Schachtanlage Asse II	
AT	Arbeitstage	Anzahl der AT für die Dau- ervon Vorgängen gemäß hinterlegtem Kalender im Terminplan
AtG	Atomgesetz	Gesetz über die friedliche Verwendung der Kernener- gie und den Schutz gegen die Gefahren
AÜL	auslegungsüberschreitender Lösungszutritt	
AVP	Atomrechtlich verantwortliche Person	
BAF	Bauausführung	Realisierungsphase
BES	Beschaffung	Planungsphase
BfS	Bundesamt für Strahlenschutz	
BGL	Begleitvorgang	Terminplanbearbeitung
BMU	Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit	
BP	Beschleunigungspotenzial	Projektablaufplanung (PAP)
ВТ	Bergetechnik (BergTechn.)	
BVG	Blockvorgang	Terminplanbearbeitung
BVP	Bergrechtlich verantwortliche Person	
DD	Stichtag (data date)	Stichtagsdatum bezüglich des Datenstandes (Termine, Fertigstellungsgrad etc.)

Stand: 31.03.2013 15/17



2. Zwischenbericht zur Fortschreibung der Projektablaufplanung zum Stand 31.03.2013

DMT	DMT GmbH & Co. KG	
ELB	Einlagerungsbereich	
ELK	Einlagerungskammer	
EPL	Entwurfsplanung	Planungsphase
EPU	Erweiterte Planungsunterlage	Kosten-/Budget-Planung
ΕÜ	Endlagerüberwachung	
FE	Faktenerhebung	
FE-S1	Faktenerhebung Schritt 1	
FE-S2	Faktenerhebung Schritt 2	
FE-S3	Faktenerhebung Schritt 3	
FP	Freier Puffer	Zwischen zwei Vorgängen der Terminplanung
FSV	Firstspaltverfüllung	Stabilisierungsmaßnahme
GP	Gesamtpuffer	
GPH	Genehmigungsphase (GenehmPhase)	umfasst Genehmigungspla- nung und Genehmigungs- verfahren
GPL	Genehmigungsplanung (GenehmPlanung)	Planungsphase
GTP	Generalterminplan	Terminplanung
IS	Infrastruktur (Infra)	
KIT	Karlsruher Institut für Technologie	
Kond. Technik	Konditionierungstechnik	Verpackung von belastetem Material/Abfall
KPL	Konzeptplanung	Planungsphase
KT	Kalendertage	Anzahl der Tage für die Dauer eines Vorgangs
LAW	Low Active Waste	schwach radioaktive Abfälle
LBEG	Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie	Genehmigungsbehörde
MAW	Medium Active Waste	mittel radioaktive Abfälle
MS	Meilenstein	Terminplanung
NMU	Niedersächsisches Umweltministerium	Genehmigungsbehörde
NVM	Notfallvorsorgemaßnahmen	



2. Zwischenbericht zur Fortschreibung der Projektablaufplanung zum Stand 31.03.2013

OSD	Objektsicherungsdienst	
PAP	Projektablaufplan	Terminplanung
PFV	Planfeststellungsverfahren	Genehmigungsablauf
PSP	Projektstrukturplan	Projektorganisation, Aufbau-
REAL	Realisation	Zusammenfassung AFP, BES, BAF in der Terminpla- nung
Rev.	Revision	
RTP	Rahmenterminplan	Terminplanung
S2	Schacht Asse 2	
S5	Schacht Asse 5	
SA	Schachtanlage	
SBPL	Sonderbetriebsplan	
SFA	Schachtförderanlage	
SS	Strahlenschutz	
TA	Tiefenaufschluss	
TP	Teilprojekt	Projektorganisation, Aufbau-
TPL	Technische Planung	Zusammenfassung KPL, EPL, GPL
STP	Steuerungsterminplan	Termincontrolling
UT	Unter Tage	
UV	Umweltverträglichkeit	
UVP	Umweltverträglichkeitsprüfung	einem Genehmigungsver- fahren vorangehende Unter- suchung mit Bericht
WS	Workshop	
ZEL	Zielendlager	Finale Aufnahme von konditionierten Abfällen, die den Annahmebedingungen entsprechen
ZL	Zwischenlager	Zwischenlagerung von Abfällen mit Klassifizierung und Konditionierung

17/17 Stand: 31.03.2013



2. Zwischenbericht zur Fortschreibung der Projektablaufplanung zum Stand 31.03.2013

Anlage 1

Rahmenterminplan (RTP) Projekt Schachtanlage Asse II – Stand 27.03.2013

ARCADIS Deutschland GmbH Anlage 1 Zwischenbericht

RAHMENTERMINPLAN ASSE II

Stand 27.03.2013 Blatt 1 von 1

Fortschreibung der Projektablaufplanung

Nr.	Code	Vorgangsname	Jahr	
				'10 '12 '14 '16 '18 '20 '22 '24 '26 '28 '30 '32 '34 '36 '38 '40 '42 '44 '46
1		Meilensteine	MS	
2	MS-0016	Schachtansatzpunkt Schacht 5 festgelegt	2014	Schachtansatzpunkt Schacht 5 festgelegt
3	MS-0005	Vorlage Ergebnisse FE Schritt 1 Anbohren	2018	♦ Vorlage Ergebnisse FE Schritt 1 Anbohren
4	MS-0007	Ende Firstspaltverfüllung	2020	 Ende Firstspaltverfüllung
5	MS-0009	Beginn Öffnen der ELK FE Schritt 2	2020	Beginn Öffnen der ELK FE Schritt 2
6	MS-0008	Abschluss Notfallvorsorge und Stabilisierung	2024	♦ Abschluss Notfallvorsorge und Stabilisierung
7	MS-0013	Vorlage Ergebnisse FE Schritt 2	2027	♦ Vorlage Ergebnisse FE Schritt 2
8	MS-0020	Inbetriebnahme (IBN) Schacht 5	2028	♦ Inbetriebnahme (IBN) Schacht 5
9	MS-0027	Fertigstellung der Infrastrukturbereiche	2028	♦ Fertigstellung der Infrastrukturbereiche
10	MS-0028	Zwischenlager aufnahmebereit	2031	
11	MS-0029	Ende der FE Schritt 3 probeweises Bergen	2031	▶ Ende der FE Schritt 3 probeweises Berger
12	MS-0031	Beginn der Rückholung	2033	♦ Beginn der Rückholung
13		Umsetzungszeiträume	Beginn	
14	01	Notfallvorsorge und Stabilisierung	2010	Notfallvorsorge und Stabilisierung
15	02	Vorbereitende Maßnahmen	2010	▼ Vorbereitende Maßnahmen
16	02-FE-1	Faktenerhebung Schritt 1 (FE-1) Anbohren	2010	Faktenerhebung Schritt 1 (FE-1) Anbohren
17	02-FE-2	Faktenerhebung Schritt 2 (FE-2) Öffnen	2016	Faktenerhebung Schritt 2 (FE-2) Öffnen
18	02-FE-3	Faktenerhebung Schritt 3 (FE-3) Probebergen	2020	Faktenerhebung Schritt 3 (FE-3) Probebe
19	02-BT	Bergungstechnik	2012	Bergungstechnik
20	02-S5-TPL	Schacht 5 - Technische Planung (TPL)	2012	Schacht 5 - Technische Planung (TPL)
21	02-S5-GPH	Schacht 5 _ Genehmigung (GPH)	2017	Schacht 5 - Genehmigung (GPH)
22	02-S5-REA	Schacht 5 _ Realisation (AFP, BES, BAF)	2020	Schacht 5 _ Realisation (AFP, BES, BAF)
23	02-IN	Errichtung Infrastruktur über und unter Tage	2022	Errichtung Infrastruktur über und unter Ta
24	03	Zwischenlager (ZL)	2011	Planung Bau Zwischenlager
24	0.4	Rückholung der radioaktiven Abfälle	2033	_Rückholung der radioaktiven Abfälle
25	04			



2. Zwischenbericht zur Fortschreibung der Projektablaufplanung zum Stand 31.03.2013

Anlage 2

Meilensteinliste



Nr.	Meilenstein	Beschreibung			
MS-0001	Anbohren der ELK 7/750, Faktenerhebung Schritt 1 Nach Abarbeitung der Auflagen der Genehmigungst (NMU, LBEG) kann mit der ersten Bohrung der Verschlussbauwerk der Einlagerungskammer 7/750 b. werden. Nach Erstellung der Bohrungen entsprechende Proben aus der Kammer entnomme Auswertung der Untersuchungen können nach bergre Genehmigung die weiteren Bohrungen (B, C, D) erwerden.				
MS-0002	Fertigstellung Bohrungen ELK 7/750 Faktenerhebung Schritt 1	Nach Abschluss der Untersuchungen in den Bohrungen und an der Einlagerungskammer werden mit Verfüllen der Bohrungen die Untersuchungen der Faktenerhebung Schritt 1 an der ELK 7/750 abgeschlossen.			
MS-0003	Anbohren der ELK 12/750 Faktenerhebung (FE) Schritt 1	Nach Abarbeitung der Auflagen der Genehmigungsbehörden (NMU, LBEG) kann mit der ersten Bohrung durch das Verschlussbauwerk der Einlagerungskammer 12/750 begonnen werden.			
MS-0005	Vorlage Ergebnisse FE Schritt 1 Anbohren	Nach Abschluss des Schrittes 1 der Faktenerhebung (Anbohren der Einlagerungskammern und Bohrungen zur Ermittlung geotechnischer Parameter in Nahfeld der ELK) erfolgt die Auswertung der Faktenerhebung, die die erforderlichen Grundlagen für die weiteren Planungsschritte zur Faktenerhebung Schritte 2 und 3 liefert. Die Ergebnisse des Schrittes 1 der Faktenerhebung werden mit den Annahmen aus dem Optionenvergleich und den Kriterien verglichen, um auf dieser Basis das weitere Vorgehen festzulegen.			



Anlage 2 - Meilensteinliste

Nr.	Meilenstein	Beschreibung
MS-0007	Ende Firstspaltverfüllung	Im Rahmen der Vorsorge sind die vorhandenen Firstspalte in den Abbauen der Südflanke des Grubengebäudes verfüllt worden. Mit dem Abschluss der Firstspaltverfüllung ist eine Maßnahme zur Stabilisierung umgesetzt.
MS-0008	Abschluss Notfallvorsorge und Stabilisierung	Nach Abschluss aller geplanten Vorsorgemaßnahmen sind die Vorbereitungen auf den Notfall bestmöglich abgeschlossen. Neben den anlagentechnischen Vorsorgemaßnahmen (einschl. Bevorratung der MgCl ₂ -Lösung) sind auch die untertägigen Stabilisierungen und geotechnischen Bauwerke zur Minimierung der Konsequenzen eines nicht beherrschbaren Lösungszutritts abgeschlossen.
MS-0009	Beginn Öffnen der ELK 7/750 FE Schritt 2	Nach Auswerten des Schrittes 1 der Faktenerhebung kann mit Schritt 2 - Öffnen der Einlagerungskammern 7/750 - nach Fertigstellung der Planung begonnen werden.
MS-0010	Öffnen ELK 12/750 Faktenerhebung Schritt 2	Nach abgeschlossener Planung und Genehmigung kann mit den genehmigten Ausführungsarbeiten zum Schritt 2 - Öffnen der Einlagerungskammern 12/750- begonnen werden.
MS-0013	Vorlage Ergebnisse FE Schritt 2	Nach Abschluss des Schrittes 2 der Faktenerhebung (Öffnen der Einlagerungs-kammern und Untersuchung des Versatzund Kammerzustandes) erfolgt die Auswertung der Faktenerhebung Schritt 2, die die erforderlichen Informationen zur Ergänzung der Planungsschritte zur Faktenerhebung Schritte 3 liefert. Die Ergebnisse des Schrittes 2 der Faktenerhebung werden mit den Annahmen aus dem Optionenvergleich und den Kriterien verglichen, sowie mit den Ergebnissen der "Kalt- Erprobung" für Schritt 3 als Voraussetzung zum Genehmigungsverfahren, um auf dieser Basis das weitere Vorgehen festzulegen.
MS-0016	Schachtansatzpunkt Schacht 5 festgelegt	Sämtliche aus der Voruntersuchung (Erkundungsbohrungen) und aus der Dokumentenlage verfügbaren notwendigen Informationen zur Festlegung des Schachtansatzpunktes liegen vor. Die weiteren Planungen können fortgesetzt werden.
MS-0020	Inbetriebnahme (IBN) Schacht 5	Die Errichtung des neuen Schachtes 5 und aller zur bestimmungsgemäßen Nutzung des Schachtes erforderlichen Einbauten und Nebenanlagen sowie die zum Schacht gehörenden übertägigen Infrastrukturanlagen sind fertig gestellt. Damit ist eine Voraussetzung für den Beginn der



Anlage 2 - Meilensteinliste

		Rückholungsarbeiten geschaffen.
MS-0027	Fertigstellung der Infrastrukturbereiche	Aus strahlenschutzrechtlichen Gesichtspunkten werden über- und untertägige Infrastrukturanlagen (Werkstätten, Labore, Verpackungsanlagen, Transportanlagen, Lager, Pufferlager sowohl für aktive als auch inaktive Ausrüstungen und Abfälle sowie für das Personal) erforderlich. Diese bilden ebenfalls eine Voraussetzung für den Beginn der Rückholung.
MS-0028	Zwischenlager aufnahmebereit	Mit der Aufnahmebereitschaft des fertig gestellten Zwischenlagers wurde eine weitere Voraussetzung für den Beginn der Rückholungsarbeiten geschaffen.
MS-0029	Ende der FE Schritt 3 probeweises Bergen	Die Faktenerhebung Schritt 3 (probeweise Bergung von Abfällen, Prüfung des Gebindezustandes, Erprobung der Bergungstechnik) ist abgeschlossen.
MS-0031	Beginn der Rückholung	Nach Vorliegen der entsprechenden Genehmigungen und Schaffung aller Voraussetzungen z.B. • Fertigstellung Schacht 5 • Fertigstellung Infrastruktur über und unter Tage • Fertigstellung und Inbetriebnahme Zwischenlager (Aufnahmebereitschaft) • Bereitstellung der erforderlichen Rückholungstechnologie und –technik kann mit den Rückholungsarbeiten begonnen werden.
MS-0032	Ende der Rückholung 725/750 m Sohle	Die Rückholungsarbeiten enden nach Bergung der radioaktiven Abfälle und Rückbau der nicht mehr für die Verwahrung benötigten Ausrüstungen und Anlagen.
MS-0036	Abschluss Verwahrung	Die Stilllegung des Endlagers ASSE wird mit der Verwahrung des Bergwerkes und anschließenden übertägigen Rückbau- und Rekultivierungs-arbeiten abgeschlossen.



2. Zwischenbericht zur Fortschreibung der Projektablaufplanung zum Stand 31.03.2013

Anlage 3.1

Risikoliste - Stand 31.03.2013

Ergänzung zur Risikoliste Stand 09.05.2012



Anlage 3.1 - Risikoliste, Stand 31.03.2013

(Risikoliste Anlage 3.1 wird durch Risikoliste Anlage 3.2 ergänzt)

Nr.	Risikoart	Status Risiko	Einzelrisiko	Auswirkungen	Präventionsmaßnahmen (PM)	Status PM	Kompensationsmaßnahmen (KM)	Status KM	Quelle
	1	ı	Tu. 6 1 == 0 11 1						
001		aktiv	Abwerfen der 750-m-Sohle ohne alternativen Bohrstandort für die Bauausführung der Faktenerhebung Schritt 1 der ELK 12/750	Ziele der Faktenerhebung und Erkundungsergebnisse für die weitere Planung der Faktenerhebung sowie der Rückholung werden nicht erreicht					Arbeitsgruppe "Beschleunigung" März 2013
002	Risiko	aktiv	Sofortige Entwicklung (F&E) abdeckender Bergungstechnologien => entwickelte Bergungstechnologie nicht geeignet => Neuentwicklungen erforderlich	Auswirkung auf Termine, Kosten und Qualität					Arbeitsgruppe "Beschleuni- gung" März 2013
003	Technisches	aktiv	Anbohren der ELK 12 / 750 von der 700m-Sohle birgt ggf. das Risiko wg. Problemen bei der Durchführung der Bohrung infolge Steilheit der Bohrung	Auswirkung auf Termine, Kosten und Qualität					Arbeitsgruppe "Beschleunigung" März 2013
004		aktiv	Aktuelle Terminangaben (mit verbundenen Infrastruktur-maßnahmen) basieren z. T auf einer Schätzung, die Erfahrungswerte und Kenngrößen heranzieht. Das damit verbundene Unsicherheitspotential in der Terminplanung beinhaltet somit Kostenrisiken.	Auswirkung auf Kosten					Arbeitsgruppe "Beschleuni- gung" März 2013

Anlage 3.1 - Risikoliste, Stand 31.03.2013

(Risikoliste Anlage 3.1 wird durch Risikoliste Anlage 3.2 ergänzt)

Nr.	Risikoart	Status Risiko	Einzelrisiko	Auswirkungen	Präventionsmaßnahmen (PM)	Status PM	Kompensationsmaßnahmen (KM)	Status KM	Quelle
005		aktiv	Bei zeitnaher Durchführung eines Genehmigungsverfahrens für das Zwischenlager besteht das Risiko, dass ein Genehmigungsantrag nach § 6 AtG ist nicht abdeckend ist, da auch eine Konditionierung von Kernbrennstoffen im ZL notwendig.	Auswirkung auf Planungsleistungen, Termine und Kosten					Arbeitsgruppe "Beschleuni- gung" März 2013
006		aktiv	Bei zeitnaher Durchführung eines Genehmigungsverfahrens für das Zwischenlager besteht das Risiko, dass die vorzeitig erteilte Genehmigung verfällt, wenn infolge anschließenden Verzögerungen nicht rechtzeitig mit dem Bau begonnen wird.	Auswirkung auf Planungsleistungen, Termine und Kosten					Arbeitsgruppe "Beschleuni- gung" März 2013
007	nes Risiko	aktiv	Bei zeitnaher Durchführung eines Genehmigungsverfahrens für das Zwischenlager besteht das Risiko, dass zeitnah vorliegende Genehmigung nicht den ggf. abschließend erforderlichen Flächenbedarf abdeckt.	Auswirkung auf Planungsleistungen, Termine und Kosten					Arbeitsgruppe "Beschleuni- gung" März 2013
008	Organisatorisches Risiko	aktiv	Bei zeitnaher Realisierung des Zwischenlagers und der Konditionierung und späterer Nichtdurchführung der Rückholung => ggf. eine Mehrfachplanung / verlorene Planung; verlorener Invest; Leerstandskosten	Auswirkung auf Termine, Kosten, Leistung und Qualität					Arbeitsgruppe "Beschleuni- gung" März 2013
009		aktiv	Bei zeitnaher Realisierung des Zwischenlagers und Festlegung der Konditionierungstechnik (Annahme zu Endlagerungsbedingungen) wird bei späterer Anpassung der Endlagerungbedingungen ggf. eine externe Nachkonditionierung erforderlich.	Auswirkung auf Kosten und Qualität					Arbeitsgruppe "Beschleuni- gung" März 2013
010		aktiv	Sofortige Entwicklung (F&E) abdeckender Bergungstechnologien birgt das Risiko einer ggf. verlorenen Planung bzw. einer wirtschaftlich nicht optimierten Planung durch eine abdeckende Betrachtung (Neu- und Umplanungen infolge späteren Erkenntnisgewinnen)	Auswirkung auf Termine, Kosten, Leistung und Qualität					Arbeitsgruppe "Beschleuni- gung" März 2013

Anlage 3.1 - Risikoliste, Stand 31.03.2013

(Risikoliste Anlage 3.1 wird durch Risikoliste Anlage 3.2 ergänzt)

Nr.	Risikoart	Status Risiko	Einzelrisiko	Auswirkungen	Präventionsmaßnahmen (PM)	Status PM	Kompensationsmaßnahmen (KM)	Status KM	Quelle
011		aktiv	Generelle Entkopplung von Planungs- und Ausführungsleistungen und dem Auswertungsergebnis zur Faktenerhebung Schritt 3 beinhaltet Kostenrisiken infolge ggf. verlorener Planung sowie Ressourcenrisiken infolge ggf. notwendiger Planungsüberarbeitungen und zusätzlicher Koordinierungsaktivitäten.	Auswirkung auf Kosten und Qualitäten					Arbeitsgruppe "Beschleuni- gung" März 2013
012	es Risiko	aktiv	Alternative Auffahrung der Infrastrukturräume für Schacht 5 von Schacht 2 aus birgt betriebliche Risiken hinsichtlich des Abförderns des Haufwerkes aus den Neuauffahrungen über Schacht Asse 2 sowie ggf. Kapazitätskonflikte zwischen der Haufwerksverbringung und der Umsetzung der Notfallvorsorgemaßnahmen.	Betriebliche Risiken und Ressourcen- Risiken mit Auswirkung auf Termine, Kosten und Qualität					Arbeitsgruppe "Beschleuni- gung" März 2013
013	Organisatorisches Risiko	aktiv	Risiko der verlorenen Planung aufgrund fehlender Randbedingungen sowie von Umplanungs- / Anpassungsmaßnahmen bei Planung und Bauausführung bei frühestmöglichem Planungs-Bauausführungsbeginn der untertätigen Infrastruktur (z. B. Planungsbeginn auf Grundlage der Erkundungsbohrungen Schacht 5)	Auswirkung auf Termine und Kosten					Arbeitsgruppe "Beschleunigung" März 2013
014		aktiv	Annahme des Anbohrens der ELK 12 / 750 von der 700m-Sohle birgt ggf. planerischer Risiken dergestalt, dass der Standort sich als ungeeignet herausstellt und die vorgesehenen Erkundungsziele nicht erreicht werden. Darüber hinaus bestehen betriebliche Risiken in einem möglichen Konflikt mit der Erkundung des neu abzuteufenden Schachtes 5 sowie ggf. bzgl. Bewetterungssituation, Fluchtwegsituation und Haufwerkslagerung.	Auswirkung auf Termine, Kosten, Kapazitäten und Qualität					Arbeitsgruppe "Beschleuni- gung" März 2013



Anlage 3.1 - Risikoliste, Stand 31.03.2013

(Risikoliste Anlage 3.1 wird durch Risikoliste Anlage 3.2 ergänzt)

Nr.	Risikoart	Status Risiko	Einzelrisiko	Auswirkungen	Präventionsmaßnahmen (PM)	Status PM	Kompensationsmaßnahmen (KM)	Status KM	Quelle
015		aktiv	o i	Auswirkung auf Termine, Kosten und Qualität					Arbeitsgruppe "Beschleuni- gung" März 2013
016	Organisatorisches Risiko	aktiv		Auswirkung auf Termine, Kosten, Qualitäten und Sicherheitniveau					Arbeitsgruppe "Beschleuni- gung" März 2013
017	Orga	aktiv	•	Auswirkung auf Termine wegen ggf. Zusätzlicher Genehmigungsauflagen					Arbeitsgruppe "Beschleuni- gung" März 2013



Anlage 3.1 - Risikoliste, Stand 31.03.2013

(Risikoliste Anlage 3.1 wird durch Risikoliste Anlage 3.2 ergänzt)

Nr.	Risikoart	Status Risiko	Einzelrisiko	Auswirkungen	Präventionsmaßnahmen (PM)	Status PM	Kompensationsmaßnahmen (KM)	Status KM	Quelle
018	s Risiko	aktiv	Risiko öffentlichen Widerstandes bei Standortfestlegung des Zwischenlagers	Terminrisiken infolge von Klageverfahren					Arbeitsgruppe "Beschleuni- gung" März 2013
019	Externe	aktiv	Standort des Zwischenlagers wird über ein aufwendiges Standortauswahlverfahren (SAV) deutschlandweit ermittelt	Terminrisiken, Auswirkung auf Planungs- Ressourcen und auf notwendige Öffentlichkeitsaktivitäten					Arbeitsgruppe "Beschleuni- gung" März 2013

Stand: 31.03.2013

Seite 5 von 5



2. Zwischenbericht zur Fortschreibung der Projektablaufplanung zum Stand 31.03.2013

Anlage 3.2

Risikoliste - Stand 09.05.2012

Anlage 3.2 Risikoliste - Stand 09.05.2012

Nr.	Risikoart	Status Risiko	Einzelrisiko	Auswirkungen	Präventionsmaßnahmen (PM)	Status PM	Kompensationsmaßnahmen (KM)	Status KM
001		aktiv	Projektverlauf	Wiederaufnahme der Planungsphase mit Einfluss auf weitere Systeme. Auswirkung auf Termine, Kosten und Leistung	Technisch sinnvolle Erkundung vor und während der Planung	offen		
002		Teilweise eingetreten	Verlust der Gebrauchstauglichkeit von Teilen des genutzten Grubengebäudes	Auswirkung auf Termine, Kosten, Leistung und Qualität	Stabilisierungsmaßnahmen; Planung von Ersatzbaue	In Ausführung	Ersatz- und Sanierungsmaßnahmen	In Vorbereitung
003		aktiv	9	Auswirkung auf Termine, Kosten, Leistung und Qualität			Alternative Stilllegung	offen
004		aktiv	9	Auswirkung auf Termine, Kosten und Leistung	Frühzeitige Standorterkundung	offen	Beschleunigung bei der Ausführung	offen
005	Technisches Risiko	aktiv	Änderungen der Annahmebedingungen eines Zielendlagers	Auswirkung auf Termine, Kosten und Leistung	Frühzeitige Festlegung und Ertüchtigung des Zielendlagers für die zu erwartenden Stoffströme und Abfallmengen	offen	Änderung des Konditionierungsverfahren	offen
006	Technisc	aktiv		Auswirkung auf Termine, Kosten, Leistung und Qualität			Alternative Stilllegung	offen
007		aktiv	Entsorgungsengpässe für betriebliche radioaktive Abfälle in flüssiger und fester Form	Auswirkung auf Termine und Kosten	Frühzeitige Bereitstellung des Entsorgungsweges	offen	Zwischenlagerung innerhalb der Anlage, damit geht eine Beschränkung (begrenztes Volumen) der Notfallvorsorge einher	offen
008		aktiv	Vollständige Rückholung gemäß Variante III der Machbarkeitsstudie ist nicht möglich	Auswirkung auf Termine, Kosten, Leistung und Qualität			Alternative Stilllegung bzw. Teilrückholung	offen
009		aktiv	9 9 9	Auswirkung auf Termine, Kosten, Leistung und Qualität	Rückholung der Gebinde	In Umsetzung	Änderung der Genehmigungsvoraussetzung	offen



Anlage 3.2 Risikoliste - Stand 09.05.2012

010		aktiv	Zustand / Bausubstanz der vorhandenen Anlagen, Systeme Baugruppen	Auswirkung auf Termine, Kosten, Leistung und Qualität	Laufende Instandhaltung	offen		
011		aktiv	Ausfall bestehender Anlagen (u.a. Schachtförderanlage Schacht 2; Bewetterung; Baustoffanlagen etc.)	Auswirkung auf Termine, Kosten, Leistung und Qualität	Laufende Instandhaltung	offen		
012	0	aktiv	Schachtförderung über Schacht 2 ist nicht gewährleistet	Das bei Auffahrung der erforderlichen untertägigen Infrastruktur anfallende Haufwerk kann nicht ausgefördert werden. Auswirkung auf Termine, Kosten und Leistung	Ertüchtigung der Schachtförderanlage	In Umsetzung	Errichtung Schacht 5	In Umsetzung
013	Technisches Risiko	aktiv	Die im Schritt 3 probeweise zu bergenden Gebinde können mangels Genehmigungsfähigkeit nicht unter Tage zwischengelagert werden	Schritt 3 kann erst beginnen, wenn entsprechende Kapazitäten und Fördermöglichkeiten nach Übertage zu Verfügung stehen. Auswirkung auf Termine, Kosten, und Leistung			Pufferlager über Tage	offen
014	Тес	aktiv	Verlorene Planungen und Bauausführungen bei Schacht 5 und Zwischenlager durch die Ergebnisse der Faktenerhebung	Auswirkung auf Termine, Kosten und Leistung				
015		aktiv	Erhöhter Lösungszutritt	Erhöter Anfall kontaminierter Lösung und Umsetzung der Notfallplanung	Vorsorgemaßnahmen	Im Aufbau tlw. umgesetzt	Notfallmaßnahmen	Im Aufbau tlw. umgesetzt
016		aktiv	Verlagerung des Lösungszutritts, Verlust der Drainagefunktion auf der 658-m- Sohle	Erhöter Anfall kontaminierter Lösung und Umsetzung der Notfallplanung	Vorsorgemaßnahmen	Im Aufbau tlw. umgesetzt	Notfallmaßnahmen	Im Aufbau tlw. umgesetzt

Anlage 3.2 Risikoliste - Stand 09.05.2012

017		aktiv	Schätzungsungenauigkeiten der Dauer von Vorgängen	Auswirkung auf Termine und Kosten	Periodische Verifikation der Ablaufplanung	offen	Fortschreibung der Planung	offen
018		aktiv	Undefinierte Vorgaben hinsichtlich Inhalt von Unterlagen und Anforderungen	Unterbrechung der Bearbeitung von betroffenen Systemen	Prozesse und Vorgaben klären	Im Aufbau tlw. umgesetzt	Überarbeitung der Vorgaben bzw. Unterlagen	offen
019		aktiv	Undefinierte Schnittstellen hinsichtlich Anforderungen aus Berg- und Atomrecht	Kapazitätenbindung, Schnittstellenproblematik Auswirkung auf Termine, Kosten, Leistung und Qualität	Prozesse und Schnittstellen definieren	Im Aufbau tlw. umgesetzt		
020		aktiv	Prozesse im Änderungsverfahren nicht eindeutig	Auswirkung auf Termine, Kosten, Leistung und Qualität	QM-Verfahren	umgesetzt	Überregelung durch Aufsichtsbehörde bzw. EÜ	umgesetzt
021	0,	aktiv	Verfügbarkeit von Sachverständigen und Experten; potentielle Interessenskonflikte bei Mehrfachbeauftragung	Verfügbarkeit bei unterschiedlichen Projektaufgaben und Interessenskonflikt bei Mehrfachbeauftragung	Reduzierung der Sachverständigen; frühzeitige Einbindung	offen		
022	Organisatorisches Risiko	aktiv	Widersprüchliche Ergebnisse von Sachverständigen aufgrund verschiedener Genehmigungsverfahren	Widersprüche und Konflikte bei den SV- Forderungen Auswirkung auf Termine und Kosten	Frühzeitige Einbindung	offen	Überregelung durch Aufsichtsbehörde bzw. EÜ	offen
023	anisatoris	aktiv	Unterschiedliche Auslegung von Regelwerken	Wiederaufnahme der Planungsphase mit Einfluss auf weitere Systeme Auswirkung auf Termine und Kosten		offen		
024	Org	aktiv	Vorlage einer nicht gesetzeskonformen Planung	Mehraufwand über alle Leistungsphasen. Auswirkung auf Termine und Kosten	Optimierung der Prozesse	offen	Vorgaben durch Aufsichtsbehörden	offen
025		aktiv	Unklare Entscheidungskompetenzen	Unterbrechung der Leistung. Auswirkung auf Termine und Kosten	Planung der Organisation	offen		
026		aktiv	Projektbeteiligte treffen Entscheidungen auf Basis von unterschiedlichen Informationsständen	Auswirkung auf Termine, Kosten, Leistung und Qualität	Einschaltung des Projektstabes Informationsmanagement Einhaltung Kommunikationsplan	offen	Einrichtung von entsprechend ausgerichteter Gremienlandschaft	offen
027		aktiv	Änderungen aufgrund Vereinbarungen mit Dritten	Wiederaufnahme der Planungsphase mit Einfluss auf weitere Systeme Auswirkung auf Termine, Kosten und Leistung		offen		
028		aktiv	Offene technische und organisatorische Entscheidungen	Auswirkung auf Termine und Kosten	Schnellstmögliche Entscheidung und Klärung durch frühzeitige Identifizierung und Ausweisung	offen		

Anlage 3.2 Risikoliste - Stand 09.05.2012

			Fehleinschätzung des Mittelbedarfs	Kosten und Leistungsverschiebung ist	Budgetmanagement und		Überplanmäßige Ausgaben beantragen	
			Terremoenatzang des wittenbedaris	erforderlich	Kostenmanagement koordinieren und		oberplannasige / tasgasen seantragen	
					verstärken:			
					Haushaltsplan /Anforderung von			
					Haushaltsmitteln an Antragsverfahren			
					anpassen und periodisch vollziehen			
029		aktiv				offen		
					Anwendung der RB Bau und somit der			
					VOB / VOL / VOF sowie sonstiger			
					endlager-spezifischer Vorgaben.			
					ÜL ". L			
					Überprüfung der SOLL-Vorgaben.			
	8		Kosten Überschreitung infolge	Auswirkung auf Termine und Kosten	Präventionsmaßnahmen der Einzelrisiken		Überplanmäßige Ausgaben beantragen	
030	isi	aktiv	Wechselwirkung mit anderer Risiken		umsetzen	offen		
	Ē							
	S		Überschreitung der EPU bei Eintreten	Auswirkung auf Termine und Kosten	Präventionsmaßnahmen der Einzelrisiken		Überplanmäßige Ausgaben beantragen	
031	ПО	aktiv	eines kostenrelevanten Risikos		umsetzen	offen		
	Ressourcen Risiko							
	~		Abweichende Forderungen der	Wiederaufnahme der Planungsphase mit	Frühzeitige Einbindung der Beteiligten		Überregelung durch Aufsichtsbehörde	
032		aktiv	prüfenden Instanzen aus wirtschaftlichen	Einfluss auf weitere Systeme Auswirkung		offen	bzw. EÜ	offen
002		anc	Betrachtungen	auf Termine und Kosten		onen.		o.i.e.i.
033		aktiv	Streiks, Pandemien	Auswirkung auf Termine und Kosten			Beschleunigung bei der Ausführung	offen
033		aktiv			.		V 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	onen
			Ressourcenüberschneidung aufgrund zusätzlicher Maßnahmen	Auswirkung auf Termine und Kosten	Minimierung von Planänderungen,		Vorhalten von Überkapazitäten geringer	
034		aktiv	Zusatzlicher Maishanmen		Flexibilisierung der Beschaffung Bereitstellung von Personal,	offen	Größenordnung	offen
					Recoursenplanung			
				Wissensverlust	Langfristige Bindung, Motivation,			
035		aktiv	Fluktuation		Schaffung und Förderung von	offen		
					Wissenstransfer; Dokumentation			

Anlage 3.2 Risikoliste - Stand 09.05.2012

036		aktiv	Einwände / Klagen Dritter gegenüber Ausführung Schacht 5	Auswirkung auf Termine und Kosten	Frühzeitige Entscheidung zur Genehmigungslage	offen	Beschleunigung bei der Ausführung	offen
037		aktiv	Die Genehmigung Schacht 5 muss nach Atomrecht erfolgen	Auswirkung auf Termine, Kosten und Leistung				
038		aktiv	Einwände / Klagen Dritter gegenüber Ausführung Zwischenlager	Auswirkung auf Termine und Kosten	Frühzeitige Entscheidung zur Genehmigungslage	offen	Beschleunigung bei der Ausführung	offen
039		aktiv	Einflussnahme lokaler Stakeholder auf den Projektablauf	Auswirkung auf Termine, Kosten, Leistung und Qualität	Beschränkung der Einflussnahme auf reine Projektbegleitung	offen		
040		aktiv	Externe Prozesse bei Behörden	Keinen Einfluss auf externe Ablaufstrukturen und Termine. Auswirkung auf Termine und Qualität	Teamprozesse mit Behörden fördern	Im Aufbau		
041		aktiv	Nachprüfung / Einsprüche / Klagen bei Vergaben	Verzögerung bei der Beschaffung	Konformität zu Vorschriften, QS und Dokumentation	offen		
042		aktiv	Marktsituation der Bieter	eingeschränkter Bietermarkt; Monopolstellungen	Aufteilen der Leistungen, Marktrecherche	offen		
043		aktiv	Preisentwicklung	Auswirkung auf Kosten und Qualität	Zügige Projektabwicklung, Preisgleitklauseln	offen		
044	ko	aktiv	Mangelhafte/verspätete Leistung seitens AN	Auswirkung auf Termine, Kosten, Leistung und Qualität	Begleitende Qualitäts- und Leistungskontrollen	Tlw. umgesetzt	Ersatzvornahme mit Beschleunigungsvorgaben	offen
045	Externes Risiko	aktiv	Änderungen aufgrund von Verordnungen, Auflagen etc. von anderen Behörden	Auswirkung auf Termine, Kosten, Leistung und Qualität			Vorgaben durch Aufsichtsbehörden	offen
046	Ext	aktiv	Änderung der Gesetzeslage	Mehraufwand über alle Leistungsphasen Auswirkung auf Termine und Kosten	Lex ASSE	offen	Vorgaben durch Aufsichtsbehörden	offen
047		aktiv	Änderung von Regelwerken	Wiederaufnahme der Planungsphase mit Einfluss auf weitere Systeme. Auswirkung auf Termine und Kosten	Prüfung der Grundbedingungen vor Beginn künftiger Teilprojekte	Im Aufbau		
048		aktiv	Umweltkatastrophen durch Wettereinflüsse	Auswirkung auf Termine, Kosten, Leistung und Qualität			Beschleunigung bei der Ausführung	offen
049		aktiv	Verzögerungen aufgrund Demonstrationen	Unterbrechungen der Leistung, Schäden an der Anlage	Öffentlichkeitsarbeit, Offenheit, Sicherheitsanlage	offen	Beschleunigung bei der Ausführung	offen
050		aktiv	Auswirkungen der öffentlichen Meinung auf Prozesse Dritter	Auswirkung auf Termine, Kosten, Leistung und Qualität	Öffentlichkeitsarbeit, Offenheit	Lfd.		
051		aktiv	Politische Lobbyarbeit und Stakeholder- Wünsche führen zu ständigen Änderungen der Zielvorgaben	Auswirkung auf Termine und Kosten	Fachlich begründete Öffent- lichkeitsarbeit und aktive Information des parlamentarischen Raumes gestalten	Lfd.	Ad-Hoc Information und Stellungnahme verteilen	Tlw. umgesetzt



2. Zwischenbericht zur Fortschreibung der Projektablaufplanung zum Stand 31.03.2013

Anlage 4.1

Annahmenliste - Stand 31.03.2013

Zwischenbericht Rev 1.4

Lfd	Lfd.Nr. Berei		cich Vorgang		Auswirkungen	Quelle
EO	1		Die Entwurfsplanung bildet nach Freigabe die Grundlage für die Erstellung der Genehmigungsplanung und Ausführungsplanung.	andauernd	Eine frühzeitige Fertigstellung der Planung und frühzeitige Genehmigung wirken sich ggf. beschleunigend auf den Beginn der Rückholung aus.	Arbeitsgruppe "Beschleunigung" März 2013
EO	2		Die Entwurfsplanung des Zwischenlagers (ZL) wartet nicht auf die Fertigstellung der Entwurfsplanung der Rückholung. Die Konditionierungstechnik kann nachläufig zum Beginn der Rückholung in Betrieb genommen werden.	kurzfristig	Möglicher früherer Beginn der Rückholung aufgrund der Parallelisierung von Faktenerhebung und Errichtung des Zwischenlagers. Durch nachläufige Inbetriebnahme der Konditionierungstechnik wird das Risiko eines Zeitverzuges bei der Rückholung durch ggf. verspätete oder langwierige Inbetriebnahme des Zwischenlagers vermieden.	Arbeitsgruppe "Beschleunigung" März 2013
EO	3		Die Planung für die Rückholung wartet weder auf die Ergebnisse der Faktenerhebung noch auf die Fertigstellung der Entwurfsplanung der Bergetechnik.	kurzfristig	Früherer Beginn der Rückholung aufgrund der Parallelisierung von Faktenerhebung und Planung der Rückholung.	Arbeitsgruppe "Beschleunigung" März 2013
EO	4	_	Beginn der Faktenerhebung Schritt 2 (Öffnen der Kammern) vor dem Abschluss der Notfallvorsorgen.	mittelfristig	Der Ablauf der Notfallvorsorge- und Stabilisierungsmaßnahmen wird ggf. umgeplant und mit den Leistungen der Faktenerhebung koordiniert. Eine Fertigstellung der Faktenerhebung ist somit früher möglich und die Rückholung wird bescheunigt.	Arbeitsgruppe "Beschleunigung" März 2013
EO	5	_	Sukzessive Umsetzung der Maßnahmen der Notfallvorsorge mit Abstimmung zu räumlichen / betrieblichen Anforderungen aus der Faktenerhebung	kurzfristig	Die Entkopplung der Maßnahmen der Faktenerhebung von der Umsetzung der Notfallvorsorgemaßnahmen kann zu einer Beschleunigung der Faktenerhebung Schritte 1 und 2 führen.	Arbeitsgruppe "Beschleunigung" März 2013
EO	6		Standortfestlegung des Zwischenlagers am Standort Asse und keine Beteiligung an dem gesetzlich nicht vorgeschriebenen Standortauswahlverfahren	kurzfristig	Zeitgewinn durch frühzeitige Planung und Beantragung der Genehmigung, so dass eine rechtzeitge Fertigstellung und Inbetriebnahme des Zwischenlagers (Aufnahmebereitschaft) vor Beginn der Rückholung erreicht werden kann.	Arbeitsgruppe "Beschleunigung" März 2013
EO	7		Mit dem Bau des Zwischenlagers kann vor Abschluss der Maßnahmen der Faktenerhebung begonnen werden.	mittelfristig	Vermeidung des Risikos eines Zeitverzuges bei der Rückholung durch ggf. verspätete oder langwierige Inbetriebnahme des Zwischenlagers.	Arbeitsgruppe "Beschleunigung" März 2013
EO	8		Die Entwicklung einer Bergetechnik wir zweigleisig (sowohl für die Faktenerhebung Schritt 2 und 3 als auch für die Rückholung) unter Berücksichtigung aller denkbaren Bedingungen geplant. Es wird nicht auf die Erkenntnisse der Faktenerhebung gewartet.	mittelfristig	Durch die Loslösung der Bergetechnik Rückholung von den abschließenden Erkenntnissen aus der Faktenerhebung und ihrer zeitnahen planerischen und technischen Umsetzung steht eine Bergetechnik rechtzeitig zum Beginn der Rückholung zur Verfügung.	Arbeitsgruppe "Beschleunigung" März 2013

Anlage 4.1 Annahmenliste - Stand 31.03.2013

Lfc	l.Nr.	Bereich	Vorgang	Termin	Auswirkungen	Quelle
EO	9		Die derzeitige Terminplanung der Teilprojekte auf Grundlage von Erfahrungswerten sowie auf den derzeitig prognostizierten geologisch-hydrogeologisch und geotechnischen Randbedingungen ist Basis der Rahmenterminplanung Stand 31.03.2013.	mittelfristig	Bei Umsetzung der eingeschätzten Termindauern und bei Realisierung der erkannten Chancen können Beschleunigungspotenziale realisiert werden .	ŭ
EO	10		Die Konzeptplanung für die Infrastruktur über Tage wird parallel zur Entwurfsplanung der Rückholung erstellt und basiert auf den Ergebnissen des Schrittes 2 der Faktenerhebung.	mittelfristig	Die Parallelisierung der Planungsleistungen ergibt ggf. eine Beschleunigung der Rückholung.	Arbeitsgruppe "Beschleunigung" März 2013
EO	11		Beginn vertiefter Planungen(Entwurfsplanungen) der Infrastrukturräume für Schacht Asse 5	mittelfristig	Frühere Fertigstellung der Infrastrukturräume durch parallele Bauausführungzu Schacht 5 mit der Chance eines früheren Beginns der Rückholung.	Arbeitsgruppe "Beschleunigung" März 2013
EO	12	rdnet	Errichtung eines 2. Bohrstandortes auf der 700m-Sohle zur Durchführung der Erkundungsmaßnahmen Schritt 1 der Faktenerhebung an Einlagerungskammer 12/750	kurzfristig	Zusätzlicher Zeit- und Ressourcenaufwand für das erforderliche Genehmigungsverfahren und den Beschaffungsprozess (ggf. Beschleunigungspotentiale in Planungsleistungen zur Faktenerhebung und zum Pufferlager). Notfallvorsorge und Beschleunigungsmaßnahmen auf der 750m -Sohle werden entkoppelt.	Arbeitsgruppe "Beschleunigung" März
EO	13	übergeordnet	Parallelisierung von sequentiell geplanten Abläufen bei planerischer und technischer Machbarkeit	kurzfristig	Vorgezogener Beginn in Planung und Ausführung durch Entkopplung von Erkundungsergebnissen aus der Faktenerhebung	Arbeitsgruppe "Beschleunigung" März 2013
EO	14	ָרֵ	Die Konzeptplanung für die Rückholung wartet nicht auf die Ergebnisse der Entwurfsplanung der Bergetechnik .	mittelfristig	Das Vorziehen der Konzeptplanung für die Rückholung führt zu einem früheren Beginn der Rückholung.	Arbeitsgruppe "Beschleunigung" März 2013
EO	15		Die Planungen der Bergetechniken für die Faktenerhebung Schritt 2 und 3 sowie für die Rückholung warten nicht auf die Auswertungen der Schritte 1 und 3 der Faktenerhebung. Die Bergetechik für die Faktenerhebung wird gesondert geplant, unabhängig von der abdeckenden Planung der Bergetechnik der Rückholung.	mittelfristig	Eine Bergetechnik steht rechtzeitig vor Beginn der Rückholung zur Verfügung.	Arbeitsgruppe "Beschleunigung" März 2013
EO	16		Die Bergetechnik für die Rückholung wird für MAW- und LAW- Gebinde getrennt entwickelt.	kurzfristig	Erhöhung der Sicherheit und Qualität der Bergetechnik durch Berücksichtigung bergespezifischer Anorderungen aufgrund der parallelen Entwicklungen	
EO	17		Das erforderliche Schleusenbauwerk, die Umverpackunganlage und das Pufferlager unter Tage stehen rechtzeitig für die Faktenerhebung Schritt 2 und 3 zur Verfügung.	mittelfristig	Das Pufferlager unter Tage zur begrenzten Einlagerung von Gebinden aus der Faktenerhebung Schritt 3 ist von der Inbetriebnahme des Schachtes 5 entkoppelt und frühzeitiger möglich.	

Lfc	l.Nr.	Bereich	Vorgang	Termin	Auswirkungen	Quelle
EO	18		Die Entwurfsplanung der Rückholung wird bereits auf Grundlage der Konzeptplanung der Rückholung und dem Erkenntnisgewinn aus Schritt 2 der Faktenerhebung begonnen.	mittelfristig	Ggf. früherer Beginn der Rückholung	Arbeitsgruppe "Beschleunigung" März 2013
EO	19	geordi	Mit den Entwurfsplanungen für das Bauwerk "Zwischenlager" wird nicht auf die Fertigstellung der Entwurfsplanung "Rückholung" und den Ergebnissen der Entwurfsplanung "Anlagentechnik (Konditionierung etc.) im Zwischenlager gewartet.	kurzfristig	Das Zwischenlager ist rechtzeitig zum Beginn der Rückholung aufnahmebereit.	Arbeitsgruppe "Beschleunigung" März 2013
EO	20	ņ	Die Entwurfsplanung der Faktenerhebung Schritt 2 wird mit der Faktenerhebung Schritt 1 parallelisiert.	l kurztristia	Eine frühzeitige Planung und Ausführung der Faktenerhebung wirkt sich beschleunigend auf den Beginn der Rückholung aus.	Arbeitsgruppe "Beschleunigung" März 2013



2. Zwischenbericht zur Fortschreibung der Projektablaufplanung zum Stand 31.03.2013

Anlage 4.2

Annahmenliste Asse II - Stand 09.05.2012

Anlage 4.2 - Annahmenliste ASSE II, Stand 09.05.2012

Lfo	d.Nr.	Bereich	Vorgang	Termin	Auswirkungen
EO	1		Ressourcenbereitstellung für Projektarbeit erfolgt zeitnah	kurzfristig	Die Verfügbarkeit der erforderlichen Ressourcen (z.B. Personalbedarf für Planung, Steuerung und Ausführung der jeweiligen Gewerke) wird vorausgesetzt.
EO	2		Beschaffung Planungsleistungen	andauernd	Die Dauern für die Beschaffung der Planungsleistungen sind generell mit ca. 0,5 Jahren angenommen.
EO	3	et	Lokale Stakeholder	andauernd	Die Beteiligung lokaler Stakeholder (A2B, AGO) beschränkt sich auf die Projektbegleitung. Eine wesentliche zeit- oder inhaltliche Einflussnahme auf projektrelevante Entscheidungen wird nicht unterstellt.
EO	4	übergeordnet	Notfallvorsorge- und Stabilisierungsmaßnahmen	kurz- und mittelfristig	Die Gebrauchstauglichkeit des Grubengebäudes wird vorausgesetzt. Dabei wird unterstellt, dass es zu keinem AÜL kommt, die Lösungszuflüsse sich nicht verlagern und die gebirgsmechanische Integrität unter Einbezug der erforderlichen Stabilisierungsmaßnahmen erhalten bleibt.
EO	5		Faktenerhebung Schritt 2	kurzfristig	Entsprechend den Ergebnissen des Workshop vom 18./19. Januar 2012 erfolgt zur Sicherstellung der Genehmigungsfähigkeit die Bauausführung Schritt 2 der Faktenerhebung nach Umsetzung der Notfallvorsorge und Stabilisierung.
EO	6		Auswertung der Faktenerhebung	kurz- und mittelfristig	Auswertungen der Schritte 1 bis 3 der Faktenerhebung bestätigen die technische Machbarkeit und rechtfertigen die Rückholung auch aus radiologischer Sicht.

Anlage 4.2 - Annahmenliste ASSE II, Stand 09.05.2012

Lfc	l.Nr.	Bereich	Vorgang	Termin	Auswirkungen
EO	7		Erkundungen Schacht 5	kurzfristig	Die im Zuge der Erkundungen gewonnenen Erkenntnisse lassen die Errichtung eines neuen Schachtes ohne Einschränkung zu.
EO	8		Infrastruktur Schacht 5	kurzfristig	Die vorgefundene Geologie ermöglicht ein anforderungsgerechtes Erstellen der untertägigen Infrastruktur (Lagermöglichkeit der geborgenen radiologischen Abfälle, Werkstätten, Lager für Rückholung etc.).
EO	9	rdnet	Errichtung Schacht 5	kurzfristig	Die Bauausführung des neuen Schachtes erfolgt allein unter den Maßgaben des Bergrechts. Bis zum Anschluss an das bestehende Grubengebäude ist Schacht 5 kein Teil der kerntechnischen Anlage.
EO	10	übergeordnet	Errichtung Schacht 5	kurzfristig	Es wird unterstellt, dass der unter Bergrecht genehmigte Schacht ohne aufwendige Umbauten eine atomrechtliche Genehmigung erhält.
EO	11		Genehmigungsverfahren Schacht 5 und Zwischenlager	mittelfristig	Gegen die Errichtung von Schacht 5 und Zwischenlager werden keine Einwände/Klagen Dritter erhoben.
EO	12		Betrieb des Zwischenlagers	mittelfristig	Das Betreiben des Zwischenlagers wird nach technischer Planung extern beauftragt.
EO	13		Planung und Bauausführung (BAF) Zwischenlager	mittelfristig	Die vorgefundenen örtlichen Gegebenheiten (Baugrund, Verkehrsanbindung, Tektonik etc.) lassen die Errichtung eines Zwischenlagers ohne Einschränkung zu.

Anlage 4.2 - Annahmenliste ASSE II, Stand 09.05.2012

Lfe	l.Nr.	Bereich	Vorgang	Termin	Auswirkungen
EO	14		Zwischenlager	mittelfristig	Der Fertigstellungstermin für das Zwischenlager wird nicht durch Auflagen der Genehmigung nach § 6 AtG verzögert.
EO	15		Konditionierung für das Zwischenlager	mittelfristig	Die für eine Konditionierung der radioaktiven Abfälle notwendigen Annahmebedingungen eines Zielendlagers sind bekannt.
EO	16	net	Stilllegungsvariante der Rückholung wird durch die Ergebnisse der Faktenerhebung bestätigt	mittelfristig	Die in Schritten 2 und 3 der Faktenerhebung gewonnenen Erkenntnisse zum Gebindezustand (insbes. VBA) und zur gebirgsmechanischen Situation bei der Bergung lassen eine Rückholung zu (diese ist aus Sicht des Strahlenschutzes gerechtfertigt).
EO	17	übergeordnet	Rückholung nach Variante III	mittelfristig	Die Rückholung erfolgt vollständig gemäß Variante III der Machbarkeitsstudie zur Rückholung (Rückholung aller Gebinde einschließlich eines Drittels Salzgrus des Versatzes
EO	18		Bergungstechnologie	mittelfristig	Die zu entwickelnden Bergungstechnologien lassen aus radiologischer Sicht die technische Umsetzung der Rückholung zu.
EO	19		Rückholung LAW	langfristig	Die Einlagerungskammern auf den 750-m- / 725-m-Sohlen werden unter Sicherheitsgesichtspunkten jeweils nacheinander und nicht parallel geräumt und verfüllt.
EO	20		Rückholung MAW	langfristig	Die Räumung der MAW-Kammer auf der 511-m-Sohle erfolgt parallel zu den Arbeiten auf den tieferen Sohlen.

Anlage 4.2 - Annahmenliste ASSE II, Stand 09.05.2012

L	fd.Nr.	Bereich	Vorgang	Termin	Auswirkungen
E	21		Stilllegung der Schachtanlage ASSE II	langfristig	Die sich an die Rückholung anschließende Stilllegung der Schachtanlage Asse II erfolgt gemäß Atomrecht.
E	22		Faktenerhebung Schritt 3	kurzfristig	Im Schritt 3 der Faktenerhebung geborgene Fässer werden unter Tage zwischengelagert.
E	23	übergeordnet	Faktenerhebung	kurzfristig	Während der Faktenerhebung ist die Förderung über Schacht 2 gewährleistet.
E	24	übc	Notfall- und Stabilisierungsmaßnahmen	kurzfristig	Die Ausführung der Notfall- und Stabilisierungsmaßnahmen vor Beginn Schritt 2 der Faktenerhebung ist Voraussetzung für die Genehmigungsfähigkeit.
E) 25		Errichtung Schacht 5	kurzfristig	Die Ausführung von Schacht 5 wartet nicht auf die Ergebnisse der Faktenerhebung bzw. den Nachweis der Umsetzungsfähigkeit der Entscheidung zur Rückholung.



2. Zwischenbericht zur Fortschreibung der Projektablaufplanung zum Stand 31.03.2013

Anlage 5

Ergebnisse der Arbeitsgruppe Beschleunigung (Kurzanalysen zu Beschleunigungspotenzialen)

Nr. 02	Genehmigungsplanung der Schritte 2 und 3 der Faktenerhebung
Nr. 03	Ausführung Zwischenlager mit Konditionierung so früh wie möglich – Ergänzung zu BP 032 / 034 043
Nr. 05	Planung der Rückholung vor der abschließenden Feststellung der Machbarkeit der Rückholung
Nr. 06	Entkopplung Schritt 2 der Faktenerhebung und Umsetzung Notfallvorsorgemaßnahmen
Nr. 07	Räumliche Begrenzung der Notfallvorsorge
Nr. 08	Festlegung / Durchführung eines Genehmigungsverfahrens für das Zwischenlager
Nr. 09	Ausführung Zwischenlager sowie Konditionierung so früh wie möglich
Nr. 10	Sofortige Entwicklung (F&E) abdeckender Bergungstechnologien, Konditionierungsmaßnahmen
Nr. 11	Terminplan für das Teilprojekt Schacht Asse 5 optimieren
Nr. 12	Bauwerke/Infrastruktur über Tage (IS-ÜT)
Nr. 13	Alternative Auffahrung der Infrastrukturräume für Schacht Asse 5 von Schacht Asse 2 aus
Nr. 14	Sofortiger Beginn der Planung und frühestmöglicher Beginn der Bauausführung der untertägiger Infrastruktur
Nr. 17	Anbohren der ELK 12/750 von der 700-m-Sohle
Nr. 18	Erhöhung von parallelen Abläufen - Definition von gleichzeitigen Prozessen
Nr. 23	Konzeptplanung Rückholung beginnt nach Erkundung Schacht 5
Nr. 24	Getrennte Entwicklung der Bergetechnik für Rückholung und Faktenerhebung
Nr. 25	Bergetechnik für LAW und MAW
Nr. 26	"Pufferlager UT" vor Beginn der Bauausführung der FE-S2
Nr. 27	Entwurfsplanung (EPL) für die Rückholung
Nr. 28	Ablauf und Verknüpfung des TP "Zwischenlager"
Nr. 29	Parallelisierung zwischen FE-S1 und FE-S2 (BAF und EPL)

Kurzanalyse zu Beschleunigungspotenzialen

Nr. 02

Projekt: Schachtanlag	je ASSE II				Blatt: 1 v	on 2
					Stand:02.04.2	2013
Herkunft/Bezug:	Workshop Beschleunigung:		Arbeitsgruppe:	X	Lex ASSE:	
Name: Genehmigungs	splanung der Schritte 2 und 3 der	r Fakten	erhebung			
und parallel zur Ausführ entsprechender Bearbei frühzeitig eingereicht we Grundlage des Genehm		ien die z g noch z	u erstellenden Ger usätzlich notwend	nehmig ger Sc	ungsunterlagen r Inderbetriebsplär	mit ne (SBPL)
Annahmen:	g/Diagramm auf Blatt 2 beigefügt.)					
Die Entwurfsplanung bild Ausführungsplanung. Die Ausführungsplanung	det nach Freigabe die Grundlage g wird parallel zur Genehmigungs Genehmigungsbescheiden / den 2	splanung	erstellt und berüc	·		
Genehmigungsbehörder Ressourcen-/Terminrisik Genehmigungsauflagen	ken: Eine Ausweitung der Ausfüh ist denkbar, die ggf. Neu-/Umpla ggf. bei verlorener Planung durcl	nrungspla anungen	nung aufgrund sp erfordern.	ezifisch	ner	
Chancen:						
Reduzierung von Auflag	Parallelisierung der Ausführungsp en und Nebenbestimmungen in d barbeitung der Auflagen notwend	erforderl	chen Genehmigur	-	-	amit
Auswirkungen (Termin	ne/Kosten/Qualität):					
Die Bauausführungen de	er Faktenerhebung liegen derzei e Genehmigung wirken sich ggf. b	t auf den beschleu	n kritischen Pfad. I nigend auf den Be	Eine frü eginn d	ühzeitige Fertigst er Rückholung a	ellung der us.
Empfehlung:						
Die Umsetzung der Maß	nahme wird empfohlen.					

*) Mitglieder der Arbeitsgruppe: DMT, ARCADIS, BfS

Kurzanalyse zu Beschleunigungspotenzialen

Nr. 02


Projekt: Schachtanlage ASSE II

Blatt: 2 von 2

Stand:02.04.2013

Anmerkung:

Die Einschätzungen basieren auf einer Kurzanalyse der jeweiligen Sachverhalte. Im Rahmen dieser Kurzanalyse konnten nicht alle Abhängigkeiten erschöpfend berücksichtigt werden.

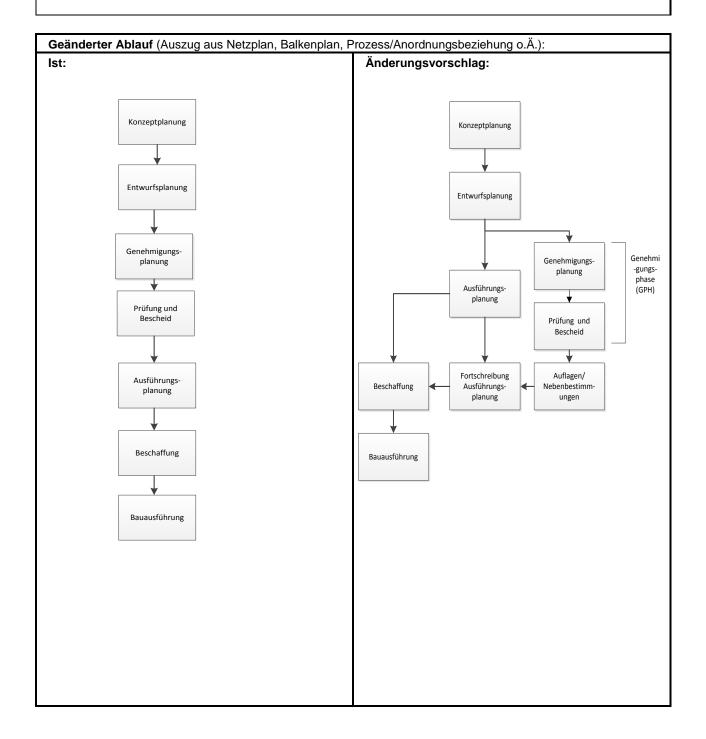

Kurzanalyse zu Beschleunigungspotenzialen

Nr. 03

Projekt: Schachtanlage ASSE II	Blatt: 1 von 2
	Stand:02.04.2013

Herkunft/Bezug:	Workshop Beschleunigung:	X	Arbeitsgruppe:	X	Lex Asse:	
Name:					_	
Ausführung Zwisch	enlager sowie Konditionierung so früh v	vie mög	glich – Ergänzung z	zu BF	032 / 034 / 043	

Kurzbeschreibung:

Die Planungsphase und die Bauausführung des Zwischenlagers (ZL) warten weder auf die Ausführungsplanung der Konditionierungstechnik noch auf die Entwurfsplanung der Rückholung. Somit ist auch die indirekte Abhängigkeit zwischen der Faktenerhebung und dem Zwischenlager aufgehoben und das Zwischenlager kann zeitlich entkoppelt realisiert werden. Gemäß Lex Asse sind Risiken zu verlorenen Planungen oder Investitionen kein Ausschlusskriterium in der Terminplanung.

Diese Änderung ist nur ein Teil des Beschleunigungspotenzials der Teilprojekte Zwischenlager und Konditionierung. Für eine differenzierte Bewertung der Änderung werden Zwischenlager und Konditionierungstechnik getrennt dargestellt (siehe auch Kurzanalyse Nr. 09).

(Hinweis: Prinzipdarstellung/Diagramm auf Blatt 2 beigefügt.)

Annahmen:

Die Entwurfsplanung des Zwischenlagers (ZL) wartet nicht auf die Fertigstellung der Entwurfsplanung der Rückholung.

Mit dem Bau des ZL kann vor Abschluss der Maßnahmen der Faktenerhebung begonnen werden.

Die Konditionierungstechnik kann nachläufig zum Beginn der Rückholung in Betrieb genommen werden. Die ggf. vor Inbetriebnahme der Konditionierungstechnik geborgenen Gebinde werden in einem Pufferlager oder ggf. im bereits fertiggestellten Teil des Zwischenlagers eingelagert.

Risiken:

Kostenrisiken: verlorene Planung und Bauausführung bei Nichtdurchführung der Rückholung (durch Lex Asse abgedeckt);

Kosten-/Terminrisiken: infolge eventueller Umplanungs-/Anpassungsmaßnahmen bei Planung und Bauausführung aufgrund der Ergebnisse der Faktenerhebung (FE);

Kostenrisiken: zusätzliche Instandhaltungs- und Betriebskosten während eines eventuellen Leerstands des Zwischenlagers vor Beginn der Rückholung;

Kostenrisiken: durch frühzeitige Festlegung von Annahmen zur notwendigen Konditionierungstechnik (Endlagerungsbedingungen) wird ggf. eine Nachkonditionierung erforderlich;

Ressourcenrisiken: Hohe Bindung von Material und Ressourcen durch zusätzliche parallele Bauausführung.

Chancen:

Das Zwischenlager (ZL) steht rechtzeitig zu Beginn der Ausführung der Rückholung zur Verfügung (Aufnahmebereitschaft);

Das Zwischenlager (ZL) kann bei frühzeitiger Fertigstellung als Pufferlager vorab geborgener Gebinde (aus Faktenerhebung) dienen.

Durch frühzeitigen Baubeginn wird gewährleistet, dass die notwendige Baugenehmigung nicht verfällt.

Auswirkungen (Termine/Kosten/Qualität):

Vermeidung des Risikos eines Zeitverzuges bei der Rückholung durch ggf. verspätete oder langwierige Inbetriebnahme des Zwischenlagers.

Möglicher früherer Beginn der Rückholung aufgrund der Parallelisierung von Faktenerhebung und Errichtung des Zwischenlagers.

*) Mitglieder der Arbeitsgruppe: DMT, ARCADIS, BfS

Kurzanalyse zu Beschleunigungspotenzialen

Nr. 03

Projekt: Schachtanlage ASSE II

Blatt: 2 von 2


Stand:02.04.2013

Empfehlung:

Aufgrund des hohen Beschleunigungspotenzials wird die Umsetzung dieser Maßnahme empfohlen.

Anmerkung:

Die Einschätzungen basieren auf einer Kurzanalyse der jeweiligen Sachverhalte. Im Rahmen dieser Kurzanalyse konnten nicht alle Abhängigkeiten erschöpfend berücksichtigt werden.

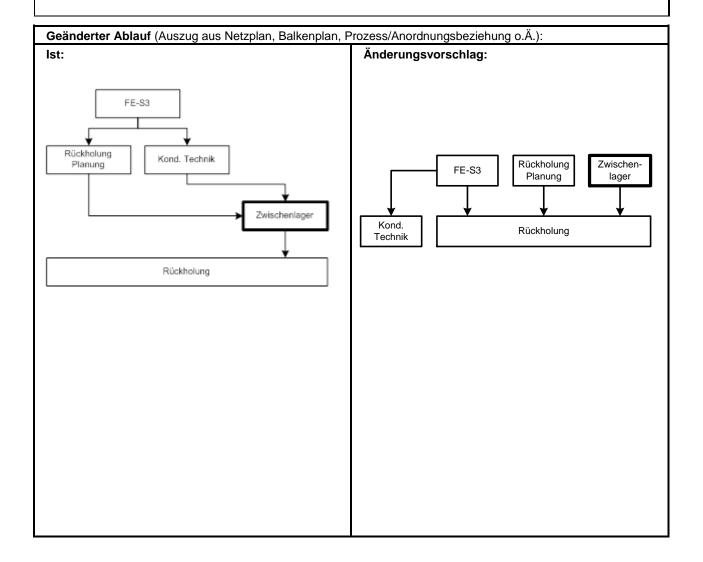

Kurzanalyse zu Beschleunigungspotenzialen

Nr. 05

Projekt: Schachtanlage ASSE II		Blatt: 1 von 2
		Stand:02.04.2013
Herkunft/Bezug: Workshop Beschleunigung: BP NN	☐ Arbeitsgruppe: ☐	Lex Asse:
Name: Planung/Ausführung von Teilprojekten (hier: Pl vor der abschließenden Feststellung der Mach		
Kurzbeschreibung:		
Als Beschleunigungspotenzial wird eine Entkopplung der Feststellung der Machbarkeit der Rückholung nach Fakte Weiterhin erfolgt die frühzeitige Ausführung der Planung	enerhebung Schritt 3 gesehen.	-
Faktenerhebung abzuwarten.	G	
Diese Änderung betrifft nicht alle im Beschleunigungspot der Rückholung, Die Teilprojekte/ bzw. –aufgaben wie Z 9 und 10 aufgeführt.		
(Hinweis: Prinzipdarstellung/Diagramm auf Blatt 2 beigefügt.)		
Annahmen: Die Planung für die Rückholung wartet weder auf die Erg Entwurfsplanung für die Bergetechnik und weiterer betro- abdeckend geplant wird und alle denkbaren Bedingunger	ffener Teilprojekte. Das heißt, das	
Risiken:		
Kostenrisiken: verlorene Planung sowie verlorene Bauau	sführung bei Nichtdurchführung o	der Rückholung (Risiko wird
durch Lex Asse abgedeckt);	oführung hoi Nou-/l-Immlamma	(Dicika wird durch I am
Kostenrisiken: verlorene Planung sowie verlorene Bauau Asse abgedeckt);	Sidiliding bei Ned-/Omplanungen	(LIPIKO MILA ARICH FEX
Ressourcenrisiken: erhöhter Planungs- und Steuerungsa		
Terminrisiken/Planerische Risiken: Ergebnisse der FE fü	hren ggf. zu umfangreichen Neu-	/Umplanungen, so dass ein
mgl. Zeitgewinn verloren geht; Genehmigungstechnische Risiken/Terminrisiken: Das Ge	anehmigungsverfahren für die Dö	ckholung kann wogen agf
fehlender Nachweise im Genehmigungsantrag sehr aufw Zeitaufwand.		
Chancen:		
Beschleunigung durch frühzeitige Planung, Entwicklung des Bauausführung.	der für die Rückholung erforderlic	hen Ausrüstung und deren
Auswirkungen (Termine/Kosten/Qualität):		
Früherer Beginn der Rückholung aufgrund der Parallelisi	erung von Faktenerhebung und F	Planung der Rückholung
5 22 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3	J	J
Empfehlung:		
Die Umsetzung der Maßnahme wird empfohlen. Gleichze Genehmigungsverfahren für alle betroffenen Maßnahme		
= =gaga.ranamon far and bottononen Mashalline	Jajoma noorannon worden mu	

Kurzanalyse zu Beschleunigungspotenzialen

Nr. 05


Projekt: Schachtanlage ASSE II

Blatt: 2 von 2

Stand:02.04.2013

Anmerkung:

Die Einschätzungen basieren auf einer Kurzanalyse der jeweiligen Sachverhalte. Im Rahmen dieser Kurzanalyse konnten nicht alle Abhängigkeiten erschöpfend berücksichtigt werden.

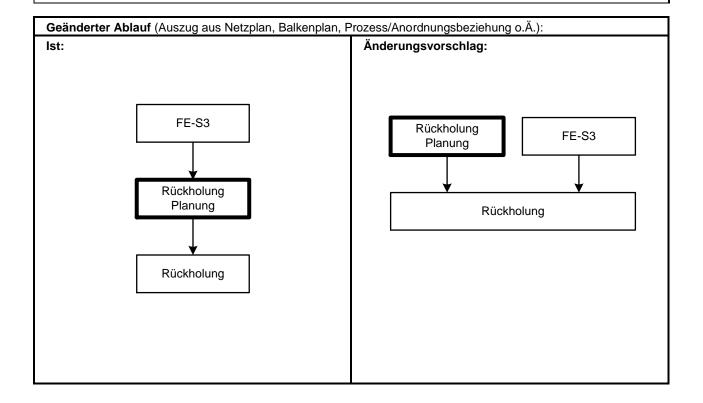

Kurzanalyse zu Beschleunigungspotenzialen

Nr. 06

Projekt: Schachtanlage ASSE II

Blatt: 1 von 2

Stand:02.04.2013

Herkunft/Bezug: Workshop Beschleunigung: Arbeitsgruppe: X Lex Asse: X

Name: Entkopplung Schritt 2 der Faktenerhebung von der Umsetzung der Notfallvorsorgemaßnahmen

Kurzbeschreibung:

Die Bauausführung des Schrittes 2 der Faktenerhebung wartet nicht auf den Abschluss der Notfallvorsorge- und Stabilisierungsmaßnahmen und nicht auf die Fertigstellung des Topfkonzepts, sondern schließt direkt an die Faktenerhebung Schritt 1 (FE-S1) an. Das unter lfd. Nr. 01 aufgezeigte Beschleunigungspotenzial wird weiter optimiert.

(Hinweis: Prinzipdarstellung/Diagramm ggf. auf Blatt 2 beigefügt.)

Annahmen:

Der Beginn der Faktenerhebung Schritt 2 (Öffnen der Kammern) vor dem Abschluss der Notfallvorsorge wird durch gesetzliche Regelungen (Lex Asse) ermöglicht.

Das Vorziehen von Maßnahmen der Faktenerhebung bewirkt keinen "Sicherheitsverzehr" und wirkt sich daher nicht nachteilig auf die Genehmigungsfähigkeit aus.

Risiken:

Die Maßnahmen der Faktenerhebung und die Notfallvorsorge- und Stabilisierungsmaßnahmen stehen bei Ausführung am selben Ausführungsort und paralleler zeitlicher Ausführung in einem Konflikt.

Die Notfallvorsorge- und Stabilisierungsmaßnahmen werden bei nachrangiger Berücksichtigung ggf. später fertig. Ursächlich hierfür sind begrenzte Kapazitäten unter Tage bei gleichzeitiger Durchführung der Notfallvorsorge, Erkundungsmaßnahmen für Schacht Asse 5, betriebliche Maßnahmen, ggf. Vorbereitung des Anschlusses von Schacht Asse 5 und der Faktenerhebung Schritt 2 (BAF FE-S2).

Chancen:

Flexibilität beim Störfallplanungswert gemäß Lex Asse, § 57b, Absatz (5).

Die Ergebnisse der Faktenerhebung liegen früher vor und können früher in der Planung und im Genehmigungsverfahren für die Rückholung verwendet werden.

Der frühzeitige Erkenntnisgewinn zum Zustand der Einlagerungskammern und der eingelagerten Gebinde beschleunigt durch zielgerichtete und ergebnisorientierte Planungen die zur Rückholung erforderlichen Vorbereitungsmaßnahmen.

Auswirkungen (Termine/Kosten/Qualität):

Die Faktenerhebung wird früher fertig und die Rückholung wird beschleunigt.

Der Ablauf der Notfallvorsorge- und Stabilisierungsmaßnahmen muss umgeplant und mit der Faktenerhebung koordiniert ausgeführt werden.

Empfehlung:

Die Umsetzung der Maßnahme wird empfohlen.

Anmerkung:

Die Einschätzungen basieren auf einer Kurzanalyse der jeweiligen Sachverhalte. Im Rahmen dieser Kurzanalyse konnten nicht alle Abhängigkeiten erschöpfend berücksichtigt werden.

Kurzanalyse zu Beschleunigungspotenzialen

Nr. 06

Projekt: Schachtanlage ASSE II

Blatt: 2 von 2

Stand:02.04.2013

Geänderter Ablauf (Auszug aus Netzplan, Balkenplan, Prozess/Anordnungsbeziehung o.Ä.):

Ist:

Topfkonzept

FE-S2

FE-S3

Rückholung

Kurzanalyse zu Beschleunigungspotenzialen

Nr. 07

Lex Asse: X

Projekt: Schachtanlage ASSE II

Blatt: 1 von 2

Stand:02.04.2013

Arbeitsgruppe:

Name: Räumliche Begrenzung der Notfallvorsorge

Kurzbeschreibung:

Herkunft/Bezug:

Es existieren räumliche und zeitliche Konflikte zwischen Faktenerhebung Schritt 1 (FE-S1) und Umsetzung der Notfallvorsorgemaßnahmen (NVM) auf der 750-m-Sohle.

Keine Abstriche der Notfallvorsorge vornehmen, jedoch Abläufe ggf. neu planen und die Maßnahmen der Faktenerhebung und der Notfallvorsorge aufeinander abstimmen.

Workshop Beschleunigung: BP 005 X

Bisher ist keine zeitliche Streckung der Notfallvorsorge vorgesehen.

Auflösung der zeitlichen und räumlichen Konkurrenz ggf. durch Entkopplung infolge Anbohren der ELK 12/750 von der 700-m-Sohle.

(Hinweis: Prinzipdarstellung/Diagramm ggf. auf Blatt 2 beigefügt.)

Annahmen:

Die Notfallvorsorge schafft die Voraussetzung für die Rückholung. Verzögerungen sind nur in geringem Umfang tolerierbar, wenn die Faktenerhebung sonst nicht fortgesetzt werden kann.

Die Notfallvorsorge darf in ihrer Gesamtdauer nicht verzögert werden; eine Anpassung im Ablauf ist zulässig.

Risiken:

Erkundungsrisiken/Planerische Risiken: Bei Abwerfen der 750-m-Sohle ohne alternativen Bohrstandort für die Bauausführung der Faktenerhebung Schritt 1(Anbohren ELK 12/750) werden die Ziele der Faktenerhebung nicht erreicht. Erforderliche Erkundungsergebnisse für die weitere Planung der Faktenerhebung sowie der Rückholung werden nicht erreicht.

Kosten-/Terminrisiken: unverwendbare Planung bei Neu-/Umplanungen sowie neu zu beantragende Genehmigung für einen Standort außerhalb der 750-m-Sohle.

Sonstige Risiken: Eine nur teilweise umgesetzte bzw. räumlich begrenzte Umsetzung der NVM erhöht mglw. die Auswirkungen eines AÜL.

Chancen:

Zeitliche und räumliche Entkoppelung der Umsetzung der Vorsorgemaßnahmen von Maßnahmen der Faktenerhebung (FE) durch Ausführung der Faktenerhebung Schritt 1 (Anbohren ELK 12/750) ausgehend von 700-m-Sohle;

Durch Entkopplung der Maßnahmen der Faktenerhebung von der 750-m-Sohle kann ggf. mit dem Öffnen der ELK (FE-S2) begonnen werden, bevor die Notfallvorsorgemaßnahmen abgeschlossen sind;

Beschleunigung der Faktenerhebung Schritt 1 an ELK 12/750 wegen der ggf. vorhandenen Möglichkeit, den vorgesehenen Bohrplatz beibehalten zu können.

Ggf. frühzeitigerer Beginn der Faktenerhebung Schritt 2.

Auswirkungen (Termine/Kosten/Qualität):

Die Entkopplung der Maßnahmen der FE von der Umsetzung der NVM kann zu einer Beschleunigung der FE-S1 und ggf. FE-S2 führen.

Kann auf einen Bohrstandort für ELK 12/750 in Abbau 5/750 Na2 nicht verzichtet werden, müssen die zuvor genannten Maßnahmen aufeinander abgestimmt werden, was zu einer zeitlichen Verzögerung der Umsetzung der Maßnahmen führen kann.

Kurzanalyse zu Beschleunigungspotenzialen

Nr. 07

Projekt: Schachtanlage ASSE II

Blatt: 2 von 2

Stand:02.04.2013


Empfehlung:

Eine dauerhafte räumliche Begrenzung der NVM wird nicht empfohlen. Es wird jedoch empfohlen, die NVM oberhalb des Planums Abbau 5/750 Na2 erst umzusetzen, wenn die Bohr- und Erkundungsarbeiten an ELK 12/750 abgeschlossen sind.

Alternativ dazu kann, wenn die von Asse-GmbH vorgeschlagene Erkundung der ELK 12/750 ausgehend von der 700-m-Sohle technisch, bergtechnisch, genehmigungstechnisch, betrieblich sowie unter Wahrung der Erkundungsziele ohne wesentliche Einschränkungen möglich ist (vgl. BP WS008, lfd. Nr. 17), auf den Bohrstandort Abbau 5/750 Na2 für ELK 12/750 verzichtet werden.

Anmerkung:

Die Einschätzungen basieren auf einer Kurzanalyse der jeweiligen Sachverhalte. Im Rahmen dieser Kurzanalyse konnten nicht alle Abhängigkeiten erschöpfend berücksichtigt werden.

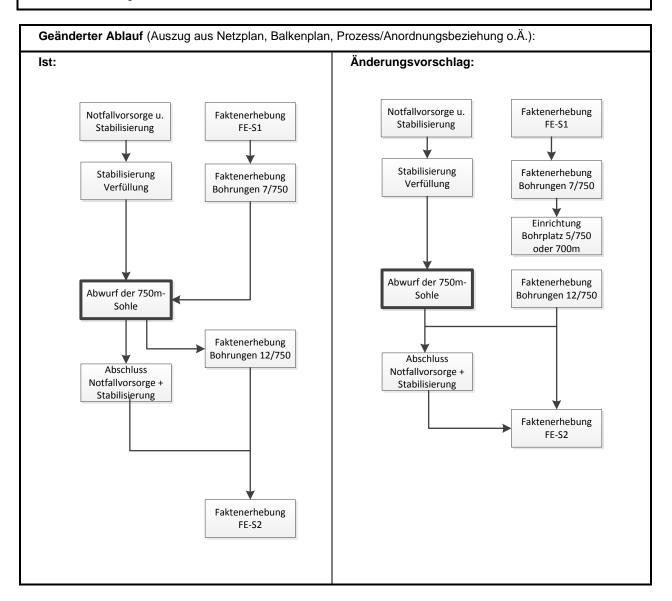

Kurzanalyse zu Beschleunigungspotenzialen

Nr. 08

Projekt: Schachtanlage ASSE II	Blatt: 1 von 2
	Stand:02.04.2013

Herkunft/Bezug:	Workshop Beschleunigung: BP 038A	X	Arbeitsgruppe:	Lex Asse:	
Name: Festlegung	zur beschleunigten Durchführung eines	Gene	ehmigungsverfahrens	für das Zwischenla	ger
Kurzbeschreibung	:				

Es erfolgt eine zügige Auswahl des Zwischenlagerstandortes als Grundlage für Genehmigungsverfahren mit einer Klärung des anzuwendenden Rechtsgebietes;

Festlegung der Zuständigkeiten des Antragstellers/Betreibers;

Festlegung der Zuständigkeit der Genehmigungs- und Aufsichtsbehörde;

Zügiges Genehmigungsverfahren (teilweise nach StrlSchV, teilweise nach AtG);

Beschleunigungspotential bei unmittelbarer Einbindung des Zwischenlagers (ZL) in ein Betriebsgelände (Verzicht auf Transport über öffentliche Straßen, keine Konditionierung für Transport erforderlich);

Eine deutschlandweite Suche erfolgt zurzeit nicht.

(Hinweis: Prinzipdarstellung/Diagramm ggf. auf Blatt 2 beigefügt.)

Annahmen:

Standortfestlegung des Zwischenlagers am Standort Asse (Pufferlager/Konditionierungstechnik und Zwischenlagerung).

Keine öffentliche Beteiligung an dem gesetzlich nicht vorgeschriebenen Standortauswahlverfahren.

Der Genehmigungsantrag für das Zwischenlager (ZL) schließt nicht nur die Lagerung, sondern auch den Umgang mit Kernbrennstoffen ein. Die Konditionierung erfolgt entsprechend genehmigter Ablaufpläne, die sicherstellen, dass die Abfälle in Anlehnung an die Annahmebedingungen für Schacht KONRAD endlagergerecht konditioniert werden. Ein Antrag nach § 6 AtG ist nicht abdeckend, da auch eine Konditionierung von Kernbrennstoffen im ZL notwendig ist.

Die Konditionierungstechnik kann nachläufig zum Beginn der Rückholung in Betrieb genommen werden. Die geborgenen Gebinde werden bis zur Inbetriebnahme der Konditionierungstechnik im Zwischenlager aufgenommen und verwahrt.

Risiken:

Genehmigungstechnische Risiken: Das Genehmigungsverfahren ist so durchzuführen, das die Gültigkeitsdauer der Genehmigung und die Realisierung auf einander abgestimmt sind.

Kosten-/Terminrisiken: Im weiteren Verlauf der Planung der Konditionierung stellt sich möglicherweise ein größerer Platzbedarf heraus als im Zwischenlager-Genehmigungsverfahren vorgesehen. Das Risiko kann durch die Planung eines modularen Aufbaus des Zwischenlager, der entsprechend dem jeweiligen Bedarf realisiert wird, reduziert werden

Terminrisiken: Klagen Dritter bei Standortfestlegung am Standort Asse;

Sonstige Risiken: Öffentlicher Widerstand bei Standortfestlegung am Standort Asse.

Chancen:

Durch frühzeitige Festlegung eines Standortes kann die Entwurfsplanung des Zwischenlagers frühzeitig als Basis für den Genehmigungsantrag verwendet werden.

Durch Festlegung auf ein § 9 AtG-Verfahren für das Zwischenlager kann das BfS auch als Antragsteller fungieren, da dann das NMU ausschließlich Genehmigungsbehörde ist.

Durch Beschränkung des Zwischenlager-Genehmigungsverfahrens auf die Konditionierungstechnik ist das Verfahren für die endlagergerechte Konditionierung der radioaktiven Abfälle nicht Prüfgegenstand des Genehmigungsverfahrens.

Auswirkungen (Termine/Kosten/Qualität):

Zeitgewinn durch frühzeitige Planung und Beantragung der Genehmigung, so dass eine rechtzeitige Fertigstellung und Inbetriebnahme des ZL zu Beginn der Rückholung erreicht werden kann.

*) Mitglieder der Arbeitsgruppe: DMT, ARCADIS, BfS

Kurzanalyse zu Beschleunigungspotenzialen

Nr. 08

Projekt: Schachtanlage ASSE II

Blatt: 2 von 2


Stand:02.04.2013

Empfehlung:

Die Umsetzung dieser Maßnahme wird empfohlen.

Anmerkung:

Die Einschätzungen basieren auf einer Kurzanalyse der jeweiligen Sachverhalte. Im Rahmen dieser Kurzanalyse konnten nicht alle Abhängigkeiten erschöpfend berücksichtigt werden.

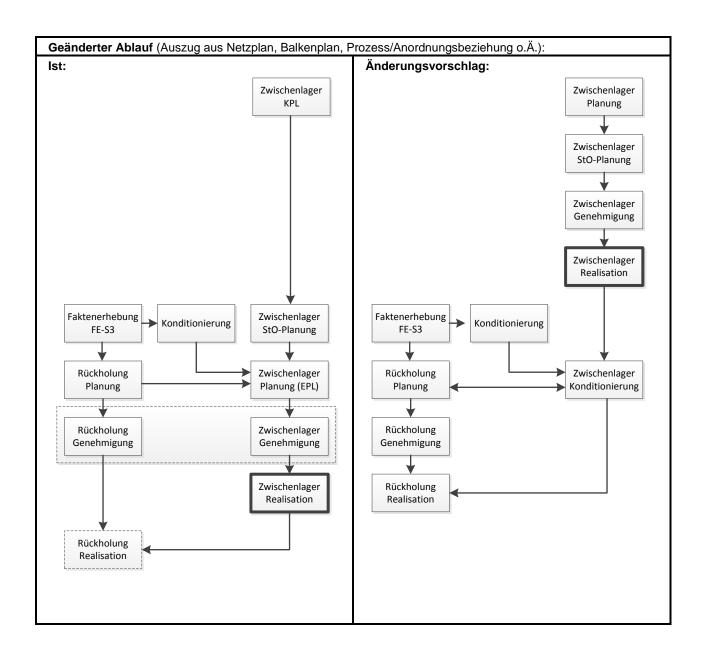

Kurzanalyse zu Beschleunigungspotenzialen

Nr. 09

Projekt: Schachtanlage ASSE II					Bla	tt: 1	von 2
					Stand:0	2.04	.2013
Herkunft/Bezug: Workshop Beschleun 034, 043	igung: <i>BP 03</i> 2,		Arbeitsgruppe:		Lex As	se:	
Name: Ausführung Zwischenlager sow	ie Konditionieru	ng so frü	h wie möglich				
Kurzbeschreibung:							
Gemeinsame Diskussion von drei Besch Bauausführung sowie frühzeitige Planur	nleunigungspote ng des Zwischer	enzialen (nlagers be	BP), die gleicherm einhalten;	naßen d	die frühzeiti	ge	
Frühe Genehmigung und vorgezogene	•				•		
Risiken bestehen ggf., wenn Annahmer spätere Anpassung der Planungen sowi machen:							
Als Voraussetzungen sind Festlegunger	n zur Standortwa	ahl sowie	zum Grunderwer	b zu tre	ffen.		
Zur Genehmigung des Zwischenlagers technischer Anlagenteile erforderlich;						mtlich	ner
Als Grundlage für das Genehmigungsve Pufferlager / Konditionierung / Lagerber			enstellung mit um	fassen	den Kenntr	nisser	n aus
(Hinweis: Prinzipdarstellung/Diagramm auf E	3latt 2 beigefügt.)						
Annahmen:							
Die Entwurfsplanung des Zwischenlage	rs wartet nicht a	uf die Fe	rtigstellung der En	ntwurfsp	olanung de	r Rüc	kholung;
Mit der Bauausführung des Zwischenlag		oschluss	der Maßnahmen o	der Fak	tenerhebur	ng be	gonnen
werden (Risiko durch Lex Asse abgede Die Konditionierungstechnik kann nachl	•	n der Rü	ckholung in Betrie	h aeno	mmen wer	den	
Die geborgenen Gebinde werden bis zu							
aufgenommen und verwahrt.							
Risiken:							
Kostenrisiken: verlorene Planung und B Asse abgedeckt);	auausführung b	ei Nichtdı	urchführung der R	lückholı	ung (Risiko	durc	ch Lex
Kosten-/Terminrisiken: infolge eventuell aufgrund nachlaufender Erkenntnisse a				bei Plai	nung und E	sauau	ısführung
Kostenrisiken: zusätzliche Instandhaltur Zwischenlagers vor Beginn der Rückhol	lung;						es
Kostenrisiken: durch frühzeitige Festleg (Endlagerungsbedingungen) wird ggf. e	ung von Annahn ine Nachkonditio	nen zur n onierung	otwendigen Kond erforderlich;	litionier	ungstechnil	K	
Ressourcenrisiken: Hohe Bindung von I	Material und Res	ssourcen	durch zusätzliche	paralle	ele Bauausi	führu	ng.
Chancen:							
Das Zwischenlager steht rechtzeitig zu	-	-	-	-			
Das Zwischenlager kann bei frühzeitige			-	-			
Durch frühzeitigen Baubeginn wird gewä	ährleistet, dass d	die notwe	ndige Baugenehn	nigung	nicht verfäl	lt.	
Auswirkungen (Termine/Kosten/Quali	 tät):						
Vermeidung des Risikos eines Zeitverzu Inbetriebnahme des Zwischenlagers.	=	ckholung	durch ggf. verspä	tete od	er langwier	ige	
Früherer Beginn der Rückholung aufgru Zwischenlagers.	nd der Parallelis	sierung vo	on Faktenerhebun	ng und E	Errichtung (des	
Empfehlung:							
Aufgrund des hohen Beschleunigungsp	otentials wird die	e Umsetz	ung dieser Maßna	ahme e	empfohlen.		

Kurzanalyse zu Beschleunigungspotenzialen

Nr. 09


Projekt: Schachtanlage ASSE II

Blatt: 2 von 2

Stand:02.04.2013

Anmerkung:

Die Einschätzungen basieren auf einer Kurzanalyse der jeweiligen Sachverhalte. Im Rahmen dieser Kurzanalyse konnten nicht alle Abhängigkeiten erschöpfend berücksichtigt werden.

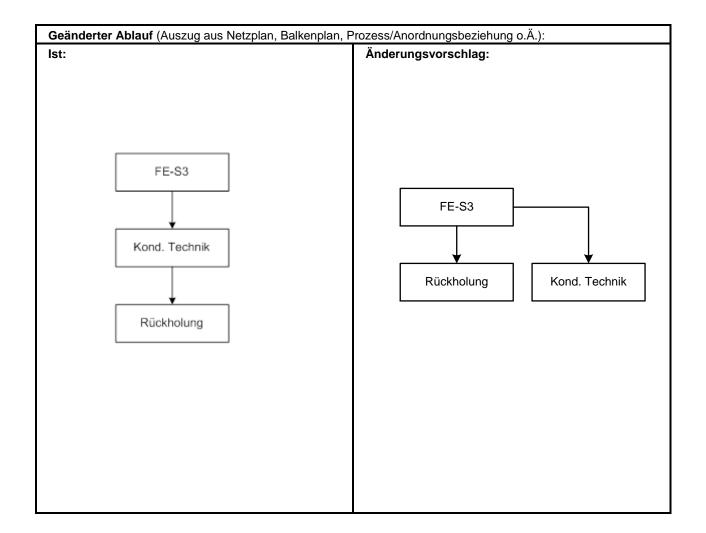

Kurzanalyse zu Beschleunigungspotenzialen

Nr. 10

,		
Projekt: Schachtanlage ASSE II		Blatt: 1 von 2
		Stand:02.04.2013
Herkunft/Bezug: Workshop Beschleunigung: <i>BP 033</i> (wurde bei BP 039, lfd. Nr. 18, u.a. diskutiert)	☐ Arbeitsgruppe:	Lex Asse:
Name: Sofortige Entwicklung (F&E) abdeckender Ber	gungstechnologien	-
Kurzbeschreibung:		
Die Entwicklung einer Bergetechnik wird für alle möglich	en Zustände der Gehinde (intakt	zerstört aufgelöst
vermengt mit Salzgrus und / oder Lauge) geplant.	en Zustande der Gebinde (intakt,	zersiori, adigelosi,
Bei der Entwicklung der Bergetechnik wird ein mögliche	r Erkenntnisgewinn aus Schritt 2 u	nd 3 der Faktenerhebung
nicht abgewartet.	<u> </u>	· ·
(Hinweis: Prinzipdarstellung/Diagramm auf Blatt 2 beigefügt.)		
Annahmen:		
Entwicklung einer abdeckenden Bergetechnik für die Rü	-	
Planung und Entwicklung der Bergetechnik für die Rück Bergetechnik für die Faktenerhebung Schritte 2 und 3;	holung unabhängig von der Planui	ng und Entwicklung der
Die Bergetechnik (BT) wird somit zweigleisig (sowohl für	r dia Eaktonorhohung Schritt 2 und	L2 ale auch für die
Rückholung) unter Berücksichtigung aller denkbaren Be		
Faktenerhebung zu warten.		
Die Zweigleisigkeit erfolgt durch kontinuierlichen Austau	sch der Erkenntnisse und Informat	tionen.
Risiken:		
Kostenrisiken: verlorene Planung sowie verlorene Bauar Lex Asse abgedeckt;	usführung durch abdeckende Betra	achtungen (Risiko durch
Ressourcenrisiken: erhöhter Planungs- und Steuerungs		
Terminrisiken/Planerische Risiken: Ergebnisse der Fakti /Umplanungen, so dass ein möglicher Zeitgewinn verlor		reichen Neu-
Terminrisiken/Planerische Risiken: Für die Rückholung der Betrachtungen aufgrund von Erkenntnissen aus der Fak		
Chancen:		
Beschleunigung durch frühzeitige Planung und Entwickl	ung zeitlich und inhaltlich unabhän	igiger Bergetechnik vor
Abschluss der Faktenerhebung; Bergungstechnik steht rechtzeitig für die Rückholung be	roit:	
Reduzierung des Planungsaufwandes für die Faktenerh		der ahdeckenden
Bergetechnik mit der Faktenerhebung entsprechend abg		
weiterer Entwicklungen für die Bergetechnik durch die F		
Auswirkungen (Termine/Kosten/Qualität):		
Bei Loslösung von der Faktenerhebung steht die Bergur	ngstechnik rechtzeitig für die Rückl	holung bereit.
Empfehlung:		
Aufgrund des Beschleunigungspotentials wird die Umse	tzung dieser Maßnahme empfohle	en;
Eine Entwicklung der Bergetechnik für die Rückholung p		
Faktenerhebung wird empfohlen. Um Planungsverluste		
Ergebnisse der Faktenerhebung in der Planung der abd	eckenden bergelechnik kontinuler	non emmeisen.

Kurzanalyse zu Beschleunigungspotenzialen

Nr. 10


Projekt: Schachtanlage ASSE II

Blatt: 2 von 2

Stand:02.04.2013

Anmerkung:

Die Einschätzungen basieren auf einer Kurzanalyse der jeweiligen Sachverhalte. Im Rahmen dieser Kurzanalyse konnten nicht alle Abhängigkeiten erschöpfend berücksichtigt werden.

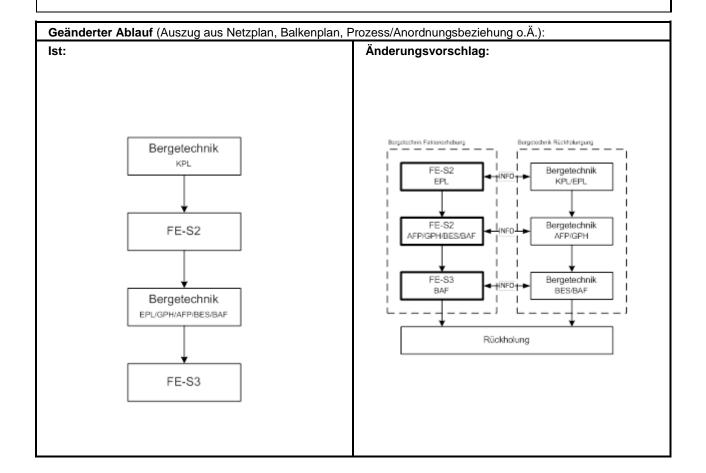

Kurzanalyse zu Beschleunigungspotenzialen

Nr. 11

Projekt: Schachtanlage ASSE II				Blatt: 1 vo	on 2
				Stand:28.03.2	.013
			_		
Herkunft/Bezug: Workshop Beschleunigung: AK BP00	05 🛚	Arbeitsgruppe:		Lex Asse:	
Name: Aktuellen Terminplan für das Teilprojekt Scha	cht Asse	5 prüfen			
Kurzbeschreibung: Der aktuelle Terminplan Schacht Asse 5 wird auf Besch Parallelisierung von Planungen und den damit verbunde Das Genehmigungsverfahren Schacht Asse 5 und der e Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung (Dau	enen Infra erforderlic ier über 2	strukturmaßnahm hen Infrastrukturm	en erg	eben könnten.	
(Hinweis: Prinzipdarstellung/Diagramm ggf. auf Blatt 2 beigefüg	t.)				
Annahmen: Die derzeitige Terminplanung des Schachtes Asse 5 ba sowie auf den derzeit prognostizierten geologisch-hydromatic der derzeit der derzei					
Risiken: Planerische Risiken/Terminrisiken: Die Genehmigungspeine umfassende Genehmigungsplanung auf der Grund Dadurch kann sich die Planungsphase verlängern und der Terminrisiken: Identifizierung von bisher nicht umfassen prüfung);	llage alle die Rückh	r betroffenen Rege nolung verzögern.	lwerke	e (BBergG, AtG, S	StrSchV).
Chancen: Identifizierung von Beschleunigungspotenzialen, z.B. Au Schacht Asse 5, Parallelisierung von technischer Planu Optimierte, realitätsnähere Ablaufplanung.					ıng
Auswirkungen (Termine/Kosten/Qualität): Wenn sich die Chancen realisieren lassen, kann eine so an das Grubengebäude erfolgen.	:hnellere	Erstellung und Anl	bindun	g des Schachtes /	Asse 5
Empfehlung: Eine Überprüfung der aktuellen Terminplanung wird em Hierbei sind speziell die Genehmigungsbehörden einzul Umweltverträglichkeitsprüfung gesondert auszuweisen; Es ist ebenfalls zu erarbeiten, inwieweit Planungen para	beziehen		3. für d	die	
Anmerkung: Die Einschätzungen basieren auf einer Kurzanalyse der konnten nicht alle Abhängigkeiten erschöpfend berücks Eine Prüfung, Bewertung und Darstellung der Auswirkur Stakeholdern vorgesehen.	ichtigt we	rden.			-


Kurzanalyse zu Beschleunigungspotenzialen

Nr. 11

Projekt: Schachtanlage ASSE II

Blatt: 2 von 2

Stand:28.03.2013

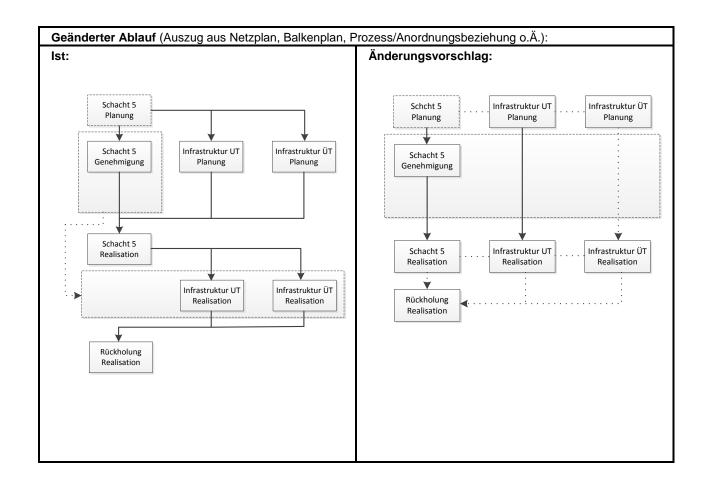

Kurzanalyse zu Beschleunigungspotenzialen

Nr. 12

Projekt: Schachtanlage ASSE II				Blatt: 1 von 2
				Stand:02.04.2013
Hardwort/Paraman W. L. L. D. L. L.		A 1 ''	71	
Herkunft/Bezug: Workshop Beschleunigung:		Arbeitsgruppe:	<u> </u>	Lex Asse:
Name: Bauwerke/Infrastruktur über Tage (IS-ÜT)				
Kurzbeschreibung:				
Die Konzeptplanung für die Infrastruktur und deren Bauv des Schrittes 3 der Faktenerhebung, sondern beginnt be Faktenerhebung.	ereits nac	h Fertigstellung des		
Die IS-ÜT ist Bestandteil der logistischen Kette für die R	ückholun	g der Abfälle.		
(Hinweis: Prinzipdarstellung/Diagramm ggf. auf Blatt 2 beigefüg	t.)			
Annahmen:				
Die Konzeptplanung für die IS-ÜT wird parallel zur Entw Beide Planungen basieren auf den Ergebnissen des Sc Nach Fertigstellung der Entwurfsplanung (EPL) der Rücl fortgeschrieben und ggf. angepasst	hrittes 2	der Faktenerhebung.		
Risiken:				
Kosten-/Terminrisiken: Im Falle von wesentlichen Änder oder Neuplanung der Konzeptplanung zur IS-ÜT erfolge Neuplanungen zeitliche Verzögerungen entstehen.	ungen de n. Hierdu	er EPL der Rückholur Irch können Mehrkos	ng m ten (uss ggf. eine Anpassung und im Falle von
Chancen: Bei richtiger Wahl der Annahmen für die KPL der IS-ÜT	ist eine E	Beschleunigung der P	lanu	ıngsaktivitäten auf dem
kritischen Pfad zum Beginn der Rückholung möglich.		3. 3		3
Auswirkungen (Termine/Kosten/Qualität):				
Für den Fall, dass die Annahmen zur Konzeptplanung IS Beschleunigung der Rückholung. Ansonsten beeinflusst der IS-ÜT den Beginn der Rückholung.				
Empfehlung:				
Die Umsetzung der Maßnahme wird empfohlen.				
-				
Anmerkung:				
Die Einschätzungen basieren auf einer Kurzanalyse der			Rahm	nen dieser Kurzanalyse
konnten nicht alle Abhängigkeiten erschöpfend berücksig Eine Prüfung, Bewertung und Darstellung der Auswirkun	-		ch D	liekussion mit dan
Stakeholdern vorgesehen.	gen IIII I	eminpian ist erst na	UII L	UBD JIIII IIUGGUACIV

^{*)} Mitglieder der Arbeitsgruppe: DMT, ARCADIS, BfS


Kurzanalyse zu Beschleunigungspotenzialen

Nr. 12

Projekt: Schachtanlage ASSE II

Blatt: 2 von 2

Stand:02.04.2013

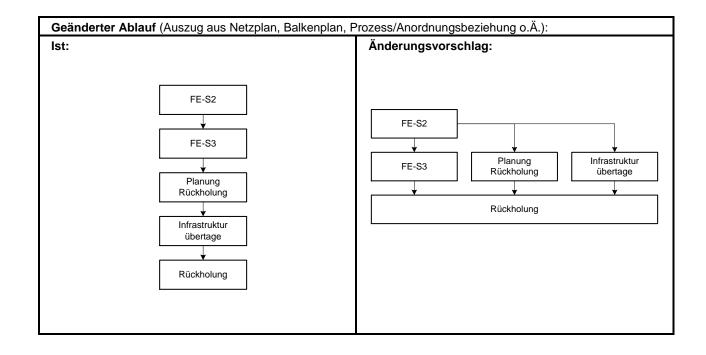

Kurzanalyse zu Beschleunigungspotenzialen

Nr. 13

Projekt: Schachtanlage ASSE II	Blat	tt: 1 von 2
	Stand:02	2.04.2013

Herkunft/Bezug: Workshop Beschleunigung: AK BP 003	☐ Arbeitsgruppe: ☐ Lex Asse: ☐
Name: Alternative Auffahrung der Infrastrukturräume für Schacht Asse 5 von Schacht Asse 2 aus	
Kurzbeschreibung:	
Bewertet wird das Auffahren neuer Infrastrukturräume in der Nähe des Schachtes Asse 5 vom bestehenden	
Grubengebäude aus, dies bei zeitlich paralleler Umsetzung zum Abteufen des Schachtes Asse 5.	
Die Ergebnisse der Erkundungsbohrungen für Schacht Asse 5 sollen dabei berücksichtigt werden.	

Die Umsetzung ist von der Klärung des Verbringens des anfallenden Haufwerkes im dem Falle abhängig, dass Schacht Asse 5 noch nicht in Betrieb ist.

(Hinweis: Prinzipdarstellung/Diagramm ggf. auf Blatt 2 beigefügt.)

Annahmen:

Beginn vertiefter Planungen (EPL) nach Auswertung der Erkundungsbohrung Schacht Asse 5;

Die geologische Situation stellt sich so dar, dass Schacht, Anschlussstrecken und Infrastrukturräume aus hydrogeologisch-geologischer und gebirgsmechanischer Sicht erstellt werden können;

Zu den Infrastrukturräumen zählen auch die Anschlussstrecken des zu erstellenden Schachtes Asse 5 zum bestehenden Grubengebäude;

Es wird in der Planung davon ausgegangen, dass ein ausreichender Sicherheitsabstand zu dem neuen Schacht bestehen bleibt, um eine radiologische Verbindung zwischen Grubengebäude und dem zu erstellenden Schacht zu vermeiden. Der Durchbruch soll erst nach Fertigstellung des Schachtes erfolgen.

Risiken:

Betriebliche Risiken: Abfördern des Haufwerkes aus den Neuauffahrungen der Infrastrukturräume über Schacht Asse 2 (inkl. einer möglichen Zwischenlagerung unter Tage) oder Verwertung des Haufwerkes in der Grube unsicher;

Ressourcenrisiken: erhöhter Planungs- und Steuerungsaufwand;

Ressourcenrisiken: beschränkte zulässige Personalkapazitäten unter Tage;

Terminrisiken: ggf. Kapazitätskonflikt zwischen Haufwerksverbringung, Umsetzung der Notfallvorsorgemaßnahmen und Faktenerhebung;

Kosten-/Terminrisiken: Neu-/Umplanungen bei Änderung der Festlegung der aufzufahrenden Füllörter Schacht Asse 5.

Chancen:

Parallelisierung der Erstellung von Schacht Asse 5 und der Infrastrukturräume am Schacht Asse 5 (einschl. der Anschlussstrecken des neuen Schachtes zum bestehenden Grubengebäude);

Verkürzung des Zeitraumes zwischen Schachtfertigstellung und Anschluss an das Grubengebäude durch frühzeitige Erstellung der Anschlussstrecken zwischen bestehendem Grubengebäude und Schacht Asse 5;

Frühzeitige zusätzliche Stabilisierung der Südflanke durch Abwurf der Infrastrukturräume auf 490-m-Sohle.

Auswirkungen (Termine/Kosten/Qualität):

Frühere Fertigstellung der Infrastrukturräume durch parallele Bauausführung zu Schacht Asse 5 führt ggf. zu einem früheren Beginn der Rückholung;

Schacht Asse 5 kann zeitnah nach seiner Erstellung über die im Rahmen der Bauausführung der Infrastrukturräume erstellten Anschlussstrecken an das Grubengebäude angeschlossen werden:

Im Grubengebäude gebirgsmechanisch gefährdete Infrastrukturräume können aufgegeben bzw. verkleinert werden.

Empfehlung:

Wenn der Abtransport bzw. die Verwertung / Lagerung des anfallenden Haufwerkes geklärt werden können, ohne Schacht Asse 5 hierzu zu benötigen, ist eine Auffahrung der Infrastrukturräume parallel zum Abteufen des Schachtes möglich.

Vor Bauausführung der Infrastrukturräume sollten wesentliche Randbedingungen der Schachtplanung Asse 5 wie z.B. Anzahl und Lage der Füllortniveaus feststehen.

*) Mitglieder der Arbeitsgruppe: DMT, ARCADIS, BfS

Kurzanalyse zu Beschleunigungspotenzialen

Nr. 13


Projekt: Schachtanlage ASSE II

Blatt: 2 von 2

Stand:02.04.2013

Anmerkung:

Die Einschätzungen basieren auf einer Kurzanalyse der jeweiligen Sachverhalte. Im Rahmen dieser Kurzanalyse konnten nicht alle Abhängigkeiten erschöpfend berücksichtigt werden.

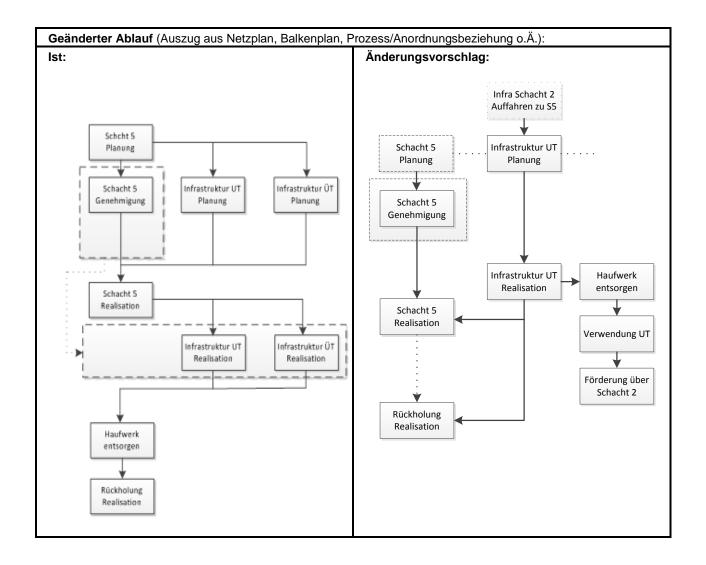

Kurzanalyse zu Beschleunigungspotenzialen

Projekt: Schachtanlage ASSE II		Blatt: 1 von 2		
		Stand:02.04.2013		
		I.		
Herkunft/Bezug: Workshop Beschleunigung: BP 035		Lex Asse:		
Name:				
Sofortiger Beginn der Planung und frühestmöglicher Beg	inn der Bauausführung der unter	tägigen Infrastruktur		
Kurzbeschreibung:				
Eine Bauausführung der Infrastrukturräume unter Tage Inbetriebnahme Schacht Asse 5 möglich. Als mögliche Bauausführung vom bestehenden Grubengebäude aus	Alternative bietet sich eine Bauau			
Der Beginn der Planung der Infrastrukturräume unter Ta		luss der		
Erkundungsbohrungen für Schacht Asse 5 und nach Vo	-	IDAD (04" -f-11 1		
Als eine weitere mögliche Planungsgrundlage können d Auslegungsanforderungen) herangezogen werden.	ie Erranrungen aus Schacht KON	RAD (Storrallanalyse +		
(Hinweis: Prinzipdarstellung/Diagramm ggf. auf Blatt 2 beigefüg	t.)			
Annahmen:	.,			
Geologische Situation stellt sich so dar, dass Schacht,	Anschlussstrecken und Infrastrukt	urräume aus		
hydrogeologisch-geologischer und gebirgsmechanische				
Zu den Infrastrukturräumen zählen auch die Anschlusss bestehenden Grubengebäude.	trecken des zu erstellenden Scha	achtes Asse 5 zum		
Planung und Bauausführung erfolgen nach Bergrecht (a	B bzal eines geplanten Pufferla	iders)		
Anforderungen aus Atomrecht sind zu berücksichtigen.		.90.07.		
Risiken:	landan Dandhadin	dunale I am A a a a		
Kosten-/Terminrisiken: Verlorene Planung aufgrund feh abgedeckt);	lender Randbedingungen (Risiko	durch Lex Asse		
Kosten-/Terminrisiken: Umplanungs-/Anpassungsmaßnahmen bei Planung und Bauausführung infolge eventueller				
Änderung der Lage und Anzahl der Füllortniveaus Schacht Asse 5.				
Chancen:				
Verkürzung des Zeitraumes bis zur Inbetriebnahme der	Infrastrukturräume durch Vorzieh	en der Planung		
Volkarzang dee Zakraamoo bio zar misemeshamine der	mastratian daton voizion	on dor rianding,		
Auswirkungen (Termine/Kosten/Qualität):				
Frühzeitig fertige Planung kann zu früherer Bauausführ	_			
Bei früherer Bauausführung der Infrastrukturräume köni gefährdete Infrastrukturräume ggf. aufgegeben werden.		le gebirgsmechanisch		
geranidete illitastrukturradine ggr. adigegeben werden.				
Empfehlung:				
Die Umsetzung dieser Maßnahme wird empfohlen. Dab		Planung Schacht Asse 5		
sowie der Rückholungsplanung erfolgen, um die Randb		det werden kürrere "F"		
Hierbei ist zu prüfen, ob Erfahrungen aus dem Planfests die Maßnahmen der Rückholung selbst wird gemäß Lex				
durchgeführt (unterliegt nicht der Planfeststellungspflich		= 1.0.0		
I and the second se				

Kurzanalyse zu Beschleunigungspotenzialen

Nr. 14


Projekt: Schachtanlage ASSE II

Blatt: 2 von 2

Stand:02.04.2013

Anmerkung:

Die Einschätzungen basieren auf einer Kurzanalyse der jeweiligen Sachverhalte. Im Rahmen dieser Kurzanalyse konnten nicht alle Abhängigkeiten erschöpfend berücksichtigt werden.

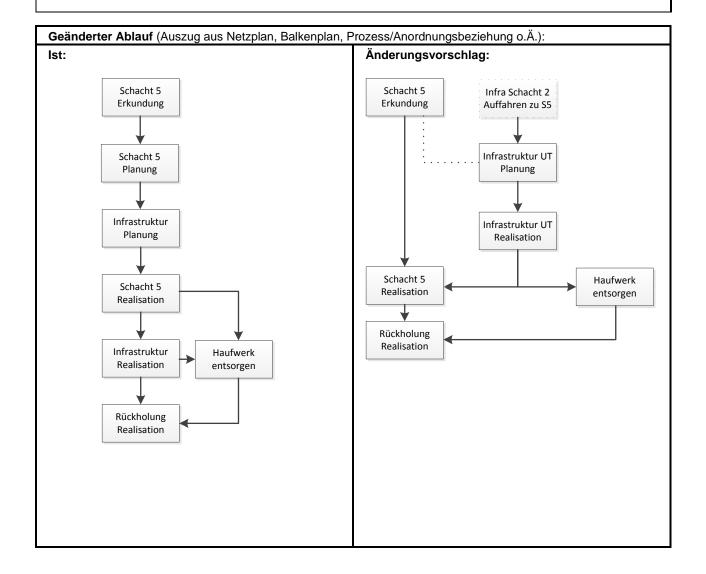

Kurzanalyse zu Beschleunigungspotenzialen

Nr. 17

Projekt: Schachtanlage ASSE II

Blatt: 1 von 3

Stand:02.04.2013

Herkunft/Bezug: Workshop Beschleunigung: Arbeitsgruppe: Lex Asse:

Name: Anbohren der ELK 12/750 von der 700-m-Sohle

Kurzbeschreibung:

Die Durchführung der Faktenerhebung Schritt 1 (FE-S1) basierte auf einer sequentiellen Bohrabfolge mit Bohrstandorten vor der jeweiligen Kammer.

Betriebliche / gebirgsmechanische Einschränkungen führen ggf. dazu, dass der Bohrstandort vor ELK 12/750 nicht genutzt werden kann. Aus diesem Grund soll ein alternativer Bohrplatz betrachtet werden, von dem ggf. die BAF FE-S1 an ELK 7/750 und 12/750 auch parallel erfolgen kann.

Der Aufbau eines parallel betriebenen 2. Betriebspunktes macht zusätzlich Personal erforderlich;

Ergänzend zu einem Bohrstandort von der 700-m-Sohle steht als 2. möglicher Bohrstandort für das Anbohren der Einlagerungskammer ELK 12/750 der Abbau 5/750 Na2 zur Verfügung. Eine Prüfung bezüglich der Erreichung der Erkundungsziele ist für beide Bohrstandorte erforderlich

(Hinweis: Prinzipdarstellung/Diagramm ggf. auf Blatt 2 beigefügt.)

Annahmen:

Errichtung eines 2. Bohrstandortes auf der 700-m-Sohle zur Durchführung der Erkundungsmaßnahmen in Schritt 1 der Faktenerhebung an ELK 12/750;

Es muss geprüft werden, ob die Einhaltung betrieblicher Restriktionen (Bewetterung, max. zulässige Belegungsstärke usw.) auch über wechselnde Betriebseinsätze der Bohrmannschaft zwischen den Betriebspunkten erreicht werden könnte.

Eine Prüfung bergtechnischer Voraussetzungen zu den Themen Auffahren neuer Grubenbaue, zur Fluchtwegsituation, zur Bewetterung und zur Bohrausrüstung sind durchzuführen.

Parallelisierung der Arbeiten FE-S1 an 2 Bohrstandorten (750-m-Sohle, Abbau 5/750 oder 700-m-Sohle);

Erneute Beschaffung des erforderlichen bohr- und strahlenschutztechnischen Equipments.

Weiterhin sind die rechtlichen Rahmenbedingungen wie die zurzeit fehlende Genehmigung zum Anbohren von der 700-m-Sohle oder notwendige Änderungen der bestehenden atom- und bergrechtlichen Genehmigungen/Zulassungen herbeizuführen.

Risiken:

Planerische Risiken: Die Eignung des Standortes auf der 700-m-Sohle zur Ausführung der geplanten Bohr- und Erkundungsarbeiten muss geprüft werden; ggf. stellt sich dieser Standort als ungeeignet heraus;

Technische Risiken: Probleme in der technischen Ausführung aufgrund des sehr steil stehenden Bohrstrangs einschl. Preventerstacks, Durchörterung von Hohlräumen zw. 700-m- und 750-m-Sohle;

Betriebliche Risiken: möglicher räumlicher Konflikt mit der Erkundung eines neu abzuteufenden Schachts Asse 5, Bewetterungssituation, Fluchtwegsituation, Haufwerkslagerung in der Strecke u.a. räumliche Konflikte auf der 700-m-Sohle; ggf. Auffahrung neuer Grubenbaue erforderlich;

Erkundungsrisiken/Genehmigungstechnische Risiken: Erreichung nicht aller Erkundungsziele, fehlende Informationen für die Genehmigungsanträge Schritte 2 und 3 der Faktenerhebung;

Gebirgsmechanische Risiken: zusätzliche Schwächung des Grubengebäudes durch hohen Nachschnitt, große Nähe der Bohrungen zu den Abbauen im Kaliflöz Staßfurt (K2);

Ressourcenrisiken: Equipment, Personal (Anzahl vorhandener erfahrenen, geschulter und unterwiesener Mitarbeiter aus Bohrtechnik, Strahlenschutz, Aufsicht sowie zulässige Anzahl der Mitarbeiter (MA) unter Tage);

Terminrisiken: fehlende Planung und Genehmigung für Bohrstandort auf 700-m-Sohle, Beschaffungszeiten für bohr- und strahlenschutztechnisches Equipment sowie Herrichtung des 2. Bohrstandortes.

Kurzanalyse zu Beschleunigungspotenzialen

Nr. 17

Projekt: Schachtanlage ASSE II

Blatt: 2 von 3

Stand:02.04.2013

Chancen:

Entkopplung der Maßnahmen der Faktenerhebung Schritt 1 und der Umsetzung der Notfallvorsorgemaßnahmen (NVM) auf der 750-m-Sohle;

Beschleunigung der FE-S1 durch Parallelisierung der Bohr- und Erkundungsarbeiten an ELK 7/750 und ELK 12/750.

Auswirkungen (Termine/Kosten/Qualität):

Zusätzlicher Zeitaufwand für das Genehmigungsverfahren zum Anbohren der ELK 12/750 von einem neuen Standort auf der 700-m-Sohle;

Neuer Beschaffungsvorgang für eine 2. Bohr-Ausrüstung und Messtechnik;

Vorgezogener Beginn von Maßnahmen (z.B. Anpassung der Planung für das Öffnen, Schnittstelle zur Bergetechnik, Planung/Ausführung des Pufferlagers), die abhängig von den Erkundungsergebnissen der Faktenerhebung Schritt 1 sind.

Empfehlung:

Die Bauausführung ausgehend von der 700-m-Sohle ist mit einem erheblichen Aufwand sowie technischen und betrieblichen Risiken verbunden. Vor Festlegung eines Bohrstandortes auf der 700-m-Sohle zum Anbohren der ELK 12/750 sollten daher die technische, bergtechnische, strahlenschutztechnische sowie betriebliche Machbarkeit sowie die terminlichen Effekte detaillierter geprüft werden. Entscheidung nach Vorlage der Untersuchungsberichte wird empfohlen.

Anmerkung:

Die Einschätzungen basieren auf einer Kurzanalyse der jeweiligen Sachverhalte. Im Rahmen dieser Kurzanalyse konnten nicht alle Abhängigkeiten erschöpfend berücksichtigt werden.


Kurzanalyse zu Beschleunigungspotenzialen

Nr. 17

Projekt: Schachtanlage ASSE II

Blatt: 3 von 3

Stand:02.04.2013

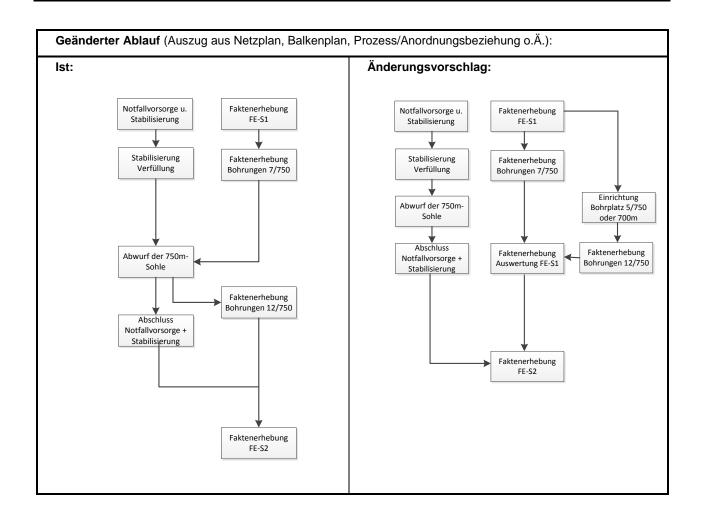

Kurzanalyse zu Beschleunigungspotenzialen

Nr. 18

Projekt: Schachtanlage ASSE II	E	Blatt: 1 von 2
	Stand	d:02.04.2013

Herkunft/	Bezug: Workshop Beschleunigung: BP 039		Arbeitsgruppe:	Lex Asse:	\square
Name:	Erhöhung von parallelen Abläufen → Definition	on von gle	eichzeitigen Prozessen		

Kurzbeschreibung:

Der Start für die Planung von Maßnahmen unter Tage (Infrastruktur UT, Pufferlager, Faktenerhebung Schritte 2 und 3 sowie der Rückholung) wird vorgezogen.

Gleichfalls vorgezogen wird der Bau des Pufferlagers unter Tage (als Bereitstellungsort für die Vorbereitung der Rückholung).

Die Entwicklung der Bergetechnik wird sofort abdeckend, ggf. mehrstufig, begonnen.

Die Entwicklung von Konditionierungsmaßnahmen als transportfähige Verpackung unter Tage (Umverpackung) erfolgt ebenfalls sofort.

Die Faktenerhebung wird terminlich entkoppelt und parallel zur Planung der Rückholung umgesetzt.

Eine Planung der Rückholung soll den jeweils neuen Erkenntnissen aus der Faktenerhebung fortlaufend angepasst werden.

(Hinweis: Prinzipdarstellung/Diagramm ggf. auf Blatt 2 beigefügt.)

Annahmen

Sequenziell geplante Vorgänge werden, soweit planerisch sinnvoll und technisch möglich, parallel abgearbeitet.

Risiken:

Kostenrisiken: verlorene Planung sowie verlorene Bauausführung bei parallelen Planungen und Bauausführungen (Bsp. Planungsprozesse zur Rückholung erfolgen parallel zur Faktenerhebung). Dieses Risiko von verlorenen Planungen oder Bauausführungen ist durch Lex Asse abgedeckt;

Ressourcenrisiken: erhöhter Planungs- und Steuerungsaufwand;

Kosten-/Terminrisiken: Ergebnisse der Faktenerhebung führen ggf. zu umfangreichen Neu-/Umplanungen, so dass ein mgl. Zeitgewinn verloren geht;

Planerische Risiken: Mögliche Qualitätsverluste durch komplexere Schnittstellendefinitionen und Erhöhung der zu treffenden Planungsannahmen;

Terminrisiken: durch fehlende Erkenntnisse und wegen notwendiger unsicherer Annahmen

Ressourcenrisiken: Parallelisierung untertägiger Bauausführungen sind durch Limitierungen des Grubengebäudes eingeschränkt.

Chancen:

Beschleunigung durch Parallelisierung von Vorgängen;

Größere Auswahl an Lösungsmöglichkeiten durch unterschiedliche Betrachtungen (Bsp. Entwicklung Bergetechnik zur Rückholung parallel zur Entwicklung Bergetechnik für Faktenerhebung)

Auswirkungen (Termine/Kosten/Qualität):

Vorgezogener Beginn von Maßnahmen, die von den Erkundungsergebnissen der Faktenerhebung entkoppelt werden:

Möglicherweise früherer Beginn der Rückholung aufgrund von terminlich parallelisierten Vorgängen.

Empfehlung:

Eine Parallelisierung sowie das Vorziehen sollte für planerisch sinnvolle und technisch mögliche Projektvorgänge umgesetzt werden. Die entsprechend notwendigen erhöhten Ressourcen bei Personal und technischer Ausrüstung sind bereitzustellen. Risiken bzgl. verlorener Planungen oder Investitionen sind durch Lex Asse abgedeckt.

*) Mitglieder der Arbeitsgruppe: DMT, ARCADIS, BfS

Kurzanalyse zu Beschleunigungspotenzialen

Nr. 18


Projekt: Schachtanlage ASSE II

Blatt: 2 von 2

Stand:02.04.2013

Anmerkung:

Die Einschätzungen basieren auf einer Kurzanalyse der jeweiligen Sachverhalte. Im Rahmen dieser Kurzanalyse konnten nicht alle Abhängigkeiten erschöpfend berücksichtigt werden.

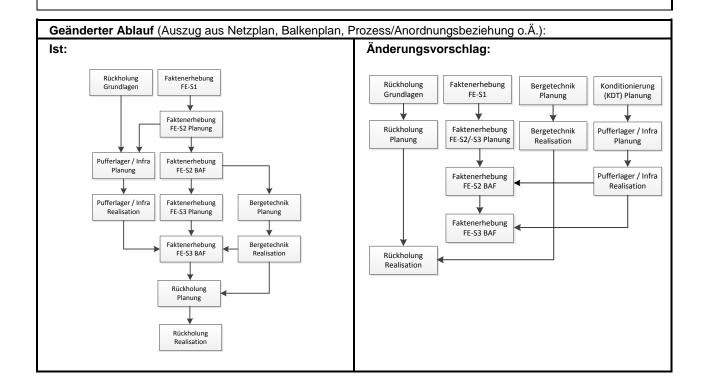

Kurzanalyse zu Beschleunigungspotenzialen

Projekt: Schachtanlage ASSE II					Blatt: 1	von 2
					Stand:19.03	3.2013
Harley of Paris Aller Day			A rib a ita arri ina a a	[V]	Law Assau	П
Herkunft/Bezug: Workshop Bes			Arbeitsgruppe:	X	Lex Asse:	
Name: Konzeptplanung "Rückholung" und Festlegung von Anforder Maschinen.						
Kurzbeschreibung: Die Konzeptplanung "Rückholung" begin wartet nicht auf die Entwurfsplanung "Be und Anbindung eines neuen Schachtes unmittelbaren Einfluss auf die zu erbring Die Logistikplanung der Rückholung mus Umverpackung mit Konditionierung, Ford Tage (IS-ÜT), Transport- und Förderkap Konzeptplanung erfassen.	ergetechnik". Für und der neuen li genden Planungs ss das Inventar, derungen an die azität sowie die	die Planunfrastruktusleistungel eine geeig Nutzung Zwischenl	ngen zur Rückholu r eine wesentliche n besitzt. gnete Bergetechnik der Infrastruktur un	ng ist Rand , Puff ter Ta	t die Kenntnis lbedingung, die ferlager und age (IS-UT) so	über Lage e
(Hinweis: Prinzipdarstellung/Diagramm ggf. a	uf Blatt 2 beigefüg	ıt.)				
Annahmen: Konzeptplanung "Rückholung" wartet nic Die Erkenntnisse der "Erkundung Schac (KPL) "Rückholung". Erkenntnisse der Faktenerhebung fließe Risiken: Kosten-/Terminrisiken:	ht Asse 5" sind i	notwendig	e Grundlagen für d	en Be	eginn der Konz	reptplanung
Ergebnisse der Faktenerhebung bewirke Fehlende Entwurfsplanungstiefe der Ber Kapazitätsberechnung für die Bergung d werden kann. Die Planung muss angepa	getechnik bewir les Inventars, di	kt möglich e durch die	erweise eine zu op e später realisierte l	timisti Berge	ische etechnik nicht (geleistet
Chancen:						
ggf. frühzeitiger Beginn der Planungspha Eine Gesamtschau zur Rückholung verri höheren Detaillierungsgrad der Genehm Genehmigungsbescheid.	ingert den Umfa	ng der abo				
Auswirkungen (Termine/Kosten/Quali	· ·	المارية	stalaboret - Cl	D- ·	an dan Da II	long as ever
Der Vorgang befindet sich derzeit auf de	m kritischen Pfa	aa und wirl	tt sich ggt. auf den	Begir	nn aer Ruckho	iung aus.

^{*)} Mitglieder der Arbeitsgruppe: DMT, ARCADIS, BfS

Kurzanalyse zu Beschleunigungspotenzialen

Nr. 23

Projekt: Schachtanlage ASSE II

Blatt: 2 von 2


Stand:19.03.2013

Empfehlung:

Die Umsetzung der Maßnahme wird empfohlen.

Anmerkung:

Die Einschätzungen basieren auf einer Kurzanalyse der jeweiligen Sachverhalte. Im Rahmen dieser Kurzanalyse konnten nicht alle Abhängigkeiten erschöpfend berücksichtigt werden.

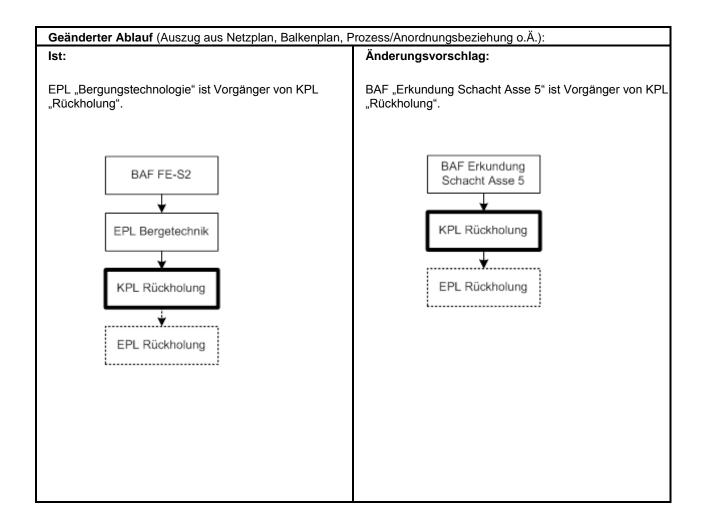

Kurzanalyse zu Beschleunigungspotenzialen

Nr. 24

Duriella Oule el Gerlere AOOF II		District Access 0
Projekt: Schachtanlage ASSE II		Blatt: 1 von 2
		Stand:28.03.2013
Herkunft/Bezug: Workshop Beschleunigung:	☐ Arbeitsgruppe:	
Name: Getrennte Entwicklung der Bergetechnik für R		ung
Kurzbeschreibung: Die Vorgänge zur Entwicklung der Bergetechnik für die Bergetechnik für die Faktenerhebung getrennt. Die F&E die "Planungsphasen und Realisierung der Rückholung Die Vorgänge zur Entwicklung der Bergetechnik für die abschließende Auswertung der Erkenntnisse zur Fakte Die Erkenntnisse aus der Faktenerhebung und aus der Informationsaustausch untereinander berücksichtigt.	E und anschließende Realisie g" integriert. Rückholung warten nicht auf nerhebung, Planung der Rückholung wer	rung der Bergetechnik wird in die Fertigstellung und die
(Hinweis: Prinzipdarstellung/Diagramm ggf. auf Blatt 2 beigefü	gt.)	
Annahmen: Die Planungen der Bergetechniken (für Faktenerhebung Faktenerhebung Schritt 1 und 2. Die Bergetechnik für de Faktenerhebung wird die Bergetechnik gesondert geplaterkenntnisse und verwendbares Gerät aus der Faktene	ie Rückholung wird abdecke int, entwickelt und für die ELk	nd geplant. Für die (7/750 und 12/750 eingesetzt.
Risiken: Terminrisiken: Neu-/Umplanungen der Bergetechnik R Termin-/Kostenrisiken: Die Erkenntnisse aus der Fakter Planungsrandbedingungen erst spät in die Entwicklung das Risiko von ggf. notwendigen Umplanungen bis hin nicht einsetzbarer Bergetechnik mit entsprechenden Ko	nerhebung Schritt 2 und 3 flie der Bergetechnik für die Rüc zu verlorenen Planungen bzw	ßen als kholung ein. Dadurch besteht
Chancen: Frühzeitige Planung und Inbetriebnahme der Bergetech	nnik Rückholung.	
Auswirkungen (Termine/Kosten/Qualität): Die Bergetechnik für die Rückholung steht frühzeitig be	reit.	
Empfehlung: Die Umsetzung der Maßnahme wird empfohlen.		
Anmerkung: Die Einschätzungen basieren auf einer Kurzanalyse de konnten nicht alle Abhängigkeiten erschöpfend berücks Eine Prüfung, Bewertung und Darstellung der Auswirku Stakeholdern vorgesehen.	ichtigt werden.	•

Geänderter Ablauf (Auszug aus Netzplan, Balkenplan, Prozess/Anordnungsbeziehung o.Ä.):

Arbeitsgruppe Beschleunigung

Kurzanalyse zu

Nr. 24 Beschleunigungspotenzialen Rahmenterminplan ASSE *) Projekt: Schachtanlage ASSE II Blatt: 2 von 2 Stand:28.03.2013 lst: Änderungsvorschlag: Faktenerhebung Planung Rückholung Bergetechnik & KPL-BT BAF - FE-S2 KPL-BT BAF - FE-S2 BAF - FE-S3 EPL/AFP/GPH/-BT EPL/AFP/GPH/-BT BES/BAF-BT BES/BAF-BT BAF - FE-S3

Kurzanalyse zu Beschleunigungspotenzialen

Nr. 25

Projekt: Schachtanlage ASSE II Blatt: 1 von 2

Stand:28.03.2013

Herkunft/Bezug: Workshop Beschleunigung: Arbeitsgruppe: X Lex Asse:

Name: Bergetechnik für LAW- und MAW-Kammern

Kurzbeschreibung:

Die Bergung der ca. 1.300 MAW-Gebinde von der 511m-Sohle erfordert gegenüber der Bergung der LAW-Gebinde eine eigene Technik. Diese berücksichtigt die Art, die Lage und den Zustand der Gebinde und wird als separate Bergetechnik BT-MAW entwickelt. Die Bergetechnik für die Rückholung teilt sich in die Bergetechnik MAW und die Bergetechnik LAW. Die Bergetechnik für die Faktenerhebung ist davon unabhängig. Ein Erfahrungs- und Informationsaustausch zwischen den unterschiedlichen Entwicklungssträngen wird gewährleistet.

(Hinweis: Prinzipdarstellung/Diagramm ggf. auf Blatt 2 beigefügt.)

Annahmen:

Die BT-MAW wird wie die BT-LAW für die Rückholung in die Planung zur Rückholung integriert.

Die Entwicklung der BT für die Faktenerhebung und BT für die Rückholung findet parallel statt. Zwischen beiden findet ein zeitl. unabhängiger Austausch statt.

Die Planung der BT-MAW und BT-LAW wird so weit wie möglich parallelisiert.

Risiken:

Die Parallelisierung der Planung erfordert zusätzliche Planungskapazitäten, die ggf. nicht im erforderlichen Umfang zur Verfügung stehen.

Chancen:

Die separate Entwicklung der Bergetechnik MAW und LAW ermöglicht eine gezielte Betrachtung der jeweiligen bergungsspezifischen Anforderungen.

Auswirkungen (Termine/Kosten/Qualität):

Aufgrund der parallelen Planung und der unveränderten Dauern haben die Vorgänge keine Auswirkungen auf die wesentlichen Meilensteine.

Empfehlung:

Die Umsetzung der Maßnahmen wird empfohlen.

Anmerkung:

Die Einschätzungen basieren auf einer Kurzanalyse der jeweiligen Sachverhalte. Im Rahmen dieser Kurzanalyse konnten nicht alle Abhängigkeiten erschöpfend berücksichtigt werden.


Kurzanalyse zu Beschleunigungspotenzialen

Nr. 25

Projekt: Schachtanlage ASSE II

Blatt: 2 von 2

Stand:28.03.2013

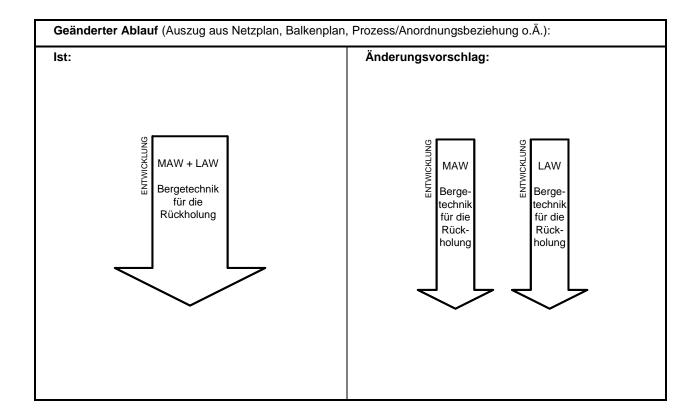

Kurzanalyse zu Beschleunigungspotenzialen

Projekt: Schachtanlage ASSE II		Blatt: 1 von 2		
		Stand:28.03.2013		
Herkunft/Bezug: Workshop Beschleunigung:	Arbeitsgruppe:	Lex Asse:		
Name: "Pufferlager UT"				
Kurzbeschreibung:				
Ein "Pufferlager UT" muss bereits Beginn der Bauausfüh Öffnen der Einlagerungskammern (ELKs) betriebsbereit		AF FE-S2), d. h. dem		
Unter den Vorgängen zum "Pufferlager UT" sind notwen Schleusenbauwerk sowie die Umverpackungsanlage für Das "Pufferlager UT" befindet sich zwischen innerer und	die Arbeiten der Faktenerhebung			
(Hinweis: Prinzipdarstellung/Diagramm ggf. auf Blatt 2 beigefüg	yt.)			
Annahmen:				
Das erforderliche Schleusenbauwerk, die Umverpackun ELK sind bis zur Ausführung der Faktenerhebung Schrit				
Die o.a. Bauwerke dienen der Faktenerhebung (Öffnen begrenzte Kapazität zur Aufnahme und Lagerung von G		ergen) und haben nur eine		
Risiken:				
Terminliche Risiken/Ressourcenrisiken: Kapazitätsengp Durchführung der Notfallvorsorgemaßnahmen unter Tag	ässe für den Einsatz von Personal ge.	und Gerät durch parallele		
Terminliche Risiken/Ressourcenrisiken: Kapazitätsengpässe bei der Pufferung von Haufwerk bzw. Abraum aus der Bauausführung der Faktenerhebung Schritte 2 und 3 in Transportbehälter wenn das Pufferlager UT nicht ausreichend dimensioniert ist.				
Chancen:	tuall baim Öffnan dar Kammarn a	ofallandaa kantaminiastaa		
Durch das Pufferlager wird auch Lagerkapazität für ever Haufwerk geschaffen.	itueli belin Offnen der Kammern al	manerides kontaminiertes		
Auswirkungen (Termine/Kosten/Qualität):				
Durch das Pufferlager und der Möglichkeit der dortigen löffnen und probeweise Bergen (Faktenerhebung Schrittentkoppelt werden und frühzeitiger beginnen.				
Empfehlung:				
Die Umsetzung der Maßnahme wird zur Sicherstellung empfohlen.	der vorgezogenen Faktenerhebung	g Schritt 2 und 3		

Kurzanalyse zu Beschleunigungspotenzialen

Nr. 26


Projekt: Schachtanlage ASSE II

Blatt: 2 von 2

Stand:28.03.2013

Anmerkung:

Die Einschätzungen basieren auf einer Kurzanalyse der jeweifigen Sachverhalte. Im Rahmen dieser Kurzanalyse konnten nicht alle Abhängigkeiten erschöpfend berücksichtigt werden.

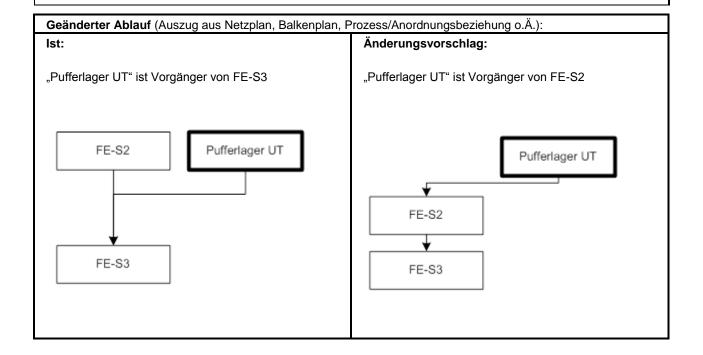

Kurzanalyse zu Beschleunigungspotenzialen

Projekt: Schachtanlage ASSE II				Blatt: 1 v	von 1
				Stand:28.03.	2013
Herkunft/Bezug: Workshop Beschleunigung:		Arbeitsgruppe:	X	Lex Asse:	
Name: Vorgezogener Beginn der Entwurfsplanung (Ef	PL) für di	e Rückholung		-	
Kurzbeschreibung: Mit der Entwurfsplanung für die Rückholung wird bereits Faktenerhebung begonnen.		Vorliegen der Ergel	bnisse	e des Schrittes 3	3 der
(Hinweis: Prinzipdarstellung/Diagramm ggf. auf Blatt 2 beigefüg	Jr. <i>)</i>				
Annahmen: Die Grundlage der Entwurfsplanung für die Rückholung Konzeptplanung für die Rückholung sowie auf den Erker Schritt 3 der Faktenerhebung (FE-S3, probeweises Bergweiteren Planungsschritte für die Rückholung ein.	nntnisgev	vinn aus Schritt 2 de	er Fak	tenerhebung. D	ie in
Risiken: Kosten-/Terminrisiken: Falls die zum Planungsbeginn ge Faktenerhebung Schritt 3 nicht bestätigt werden, entsteh Planung bzw. Kosten für erforderliche Neuplanungen. Kosten-/Terminrisiken: Durch Planungsänderungen und/Beginn der Rückholung ergeben.	nen ggf. z	usätzliche Kosten f	ür Än	derungen der vo	rhandenen
Chancen: Für den Fall, dass die Annahmen für die vorgezogene E Schritt 3 bestätigt werden, ergibt sich ein erhebliches Be					
Auswirkungen (Termine/Kosten/Qualität): Bei Eintreffen der Annahmen ergibt sich ggf. ein früherer	r Termin	für den Beginn der I	Rückh	nolung.	
Empfehlung: Die Umsetzung der Maßnahme wird empfohlen					
Anmerkung: Die Einschätzungen basieren auf einer Kurzanalyse der konnten nicht alle Abhängigkeiten erschöpfend berücksie Eine Prüfung, Bewertung und Darstellung der Auswirkun Stakeholdern vorgesehen.	chtigt we	rden.			-


Kurzanalyse zu Beschleunigungspotenzialen

Nr. 27

Projekt: Schachtanlage ASSE II

Blatt: 2 von 2

Stand:28.03.2013

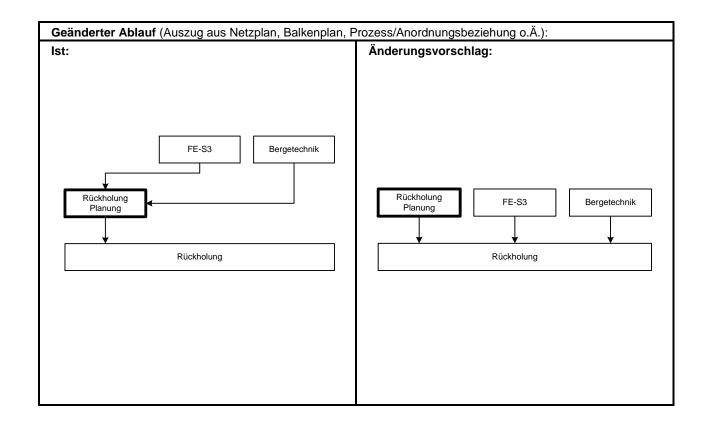

Kurzanalyse zu Beschleunigungspotenzialen

Nr. 28

Projekt: Schachtanlage ASSE II				Blatt: 1 v	on 2
				Stand:02.04.2	2013
Herkunft/Bezug: Workshop Beschleunigung:		Arbeitsgruppe:	X	Lex Asse:	\boxtimes
Name: Änderung des Ablaufs und der Verknüpfung de	s Teilpro	jektes "Zwischenla	ger" n	nit anderen Teilpro	ojekten
Kurzbeschreibung:					
Mit der Entwurfsplanung (EPL) für das "Zwischenlager" v begonnen. Beschleunigungs-Aspekte zum "Zwischenlag Abhängigkeiten der Planungsphasen wird auf die lfdNr.	er" wurd	en auch unter der If	dNr.	03 bearbeitet wo	
(Hinweis: Prinzipdarstellung/Diagramm ggf. auf Blatt 2 beigefüg	t.)				
Annahmen:					
Mit den Entwurfsplanungen für das Bauwerk "Zwischenla und die Ergebnisse der Entwurfsplanung der Anlagented					
Risiken:					
Kostenrisiken: Bei einer späteren Entscheidung gegen d der Rückholung gemäß Lex Asse Absatz 2, Satz 6, ist di einsetzbar und muss ggf. vollständig rückgebaut werden	as Zwisc	henlager nicht meh	r für d	en geplanten Zwe	
Chancen: Vorgezogene Verwendung des fertiggestellten Zwischen Gebinden (Overpacks) bis zur Klärung der Endlagerungs Konditionierungsanlage.					
Auswirkungen (Termine/Kosten/Qualität):					
Durch eine vorgezogene Fertigstellung des Zwischenlag Verfügung. Der Realisierungsvorgang "Zwischenlager" li Terminrisiken sind aufgehoben.					
Empfehlung:					
Die Umsetzung der Maßnahme wird empfohlen.					
Anmerkung:					
Die Einschätzungen basieren auf einer Kurzanalyse der konnten nicht alle Abhängigkeiten erschöpfend berücksie Eine Prüfung, Bewertung und Darstellung der Auswirkun Stakeholdern vorgesehen.	chtigt we	rden.			-

*) Mitglieder der Arbeitsgruppe: DMT, ARCADIS, BfS


Kurzanalyse zu Beschleunigungspotenzialen

Nr. 28

Projekt: Schachtanlage ASSE II

Blatt: 2 von 2

Stand:02.04.2013

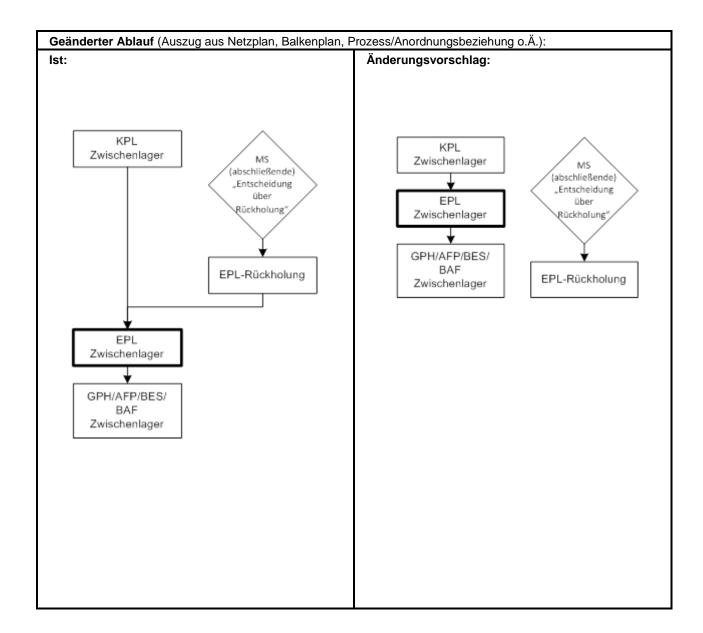

Kurzanalyse zu Beschleunigungspotenzialen

Projekt: Schachtanlage ASSE II		Blatt: 1 von 2
		Stand:19.03.2013
11 1 (6/15)		
Herkunft/Bezug: Workshop Beschleunigung:	_	X Lex Asse: □
Name: Parallelisierung zwischen Faktenerhebung Sc Faktenerhebung Schritt 2 (FE-S2)	hritt 1 (FE-S1) und Entwurfspla	nung und Bauausführung der
Kurzbeschreibung:		
Die Entwurfsplanung des Schrittes 2 der Faktenerhebun Faktenerhebung begonnen und spätestens 3 Monate na Faktenerhebung beendet.		
Die parallel anfallenden Erkenntnisse des Schrittes 1 de Monaten in die Entwurfsplanung der FE-S2 bereits einge (Hinweis: Prinzipdarstellung/Diagramm ggf. auf Blatt 2 beigefüg	earbeitet, ohne die endgültige A	
Annahmen:		
Die Entwurfsplanung FE-S2 erfolgt parallel zur Bauausfü Bauausführung (BAF) der FE-S1. Während des Nachlar eingearbeitet.		
Risiken: Terminrisiken: Im Falle geänderter Rahmenbedingunger Bohrungen der FE-S1 ist ggf. eine Anpassung und/oder	Neuplanung der Entwurfsplan	
die einen Zeitraum größer als 3 Monate erforderlich mac	cht.	
01		
Chancen: Frühzeitigere Fertigstellung der Faktenerhebung Schritt liegt.	2 und Schritt 3, deren Realisati	on auf dem kritischen Pfad
Auswirkungen (Termine/Kosten/Qualität):		
Eine frühzeitige Ausführung der Faktenerhebung wirkt si	ch ggf. beschleunigend auf der	n Rückholtermin aus.
Empfehlung:		
Die Umsetzung eines Vorziehens der Entwurfsplanung o	ler Faktenerhebung Schritt 2 w	ird empfohlen.
Anmerkung:		
Die Einschätzungen basieren auf einer Kurzanalyse der konnten nicht alle Abhängigkeiten erschöpfend berücksi Eine Prüfung, Bewertung und Darstellung der Auswirkur	chtigt werden.	•
Stakeholdern vorgesehen.	,	

Kurzanalyse zu Beschleunigungspotenzialen

Nr. 29

Projekt: Schachtanlage ASSE II

Blatt: 2 von 2

Stand:19.03.2013

